


MYTAI CONFERENCE

Παρασκευή Λιάμα
Ιωάννης Κούβαρος
Γεώργιος Λάμπρογλου
Μαρίνα-Μαρία Κοντοπούλου
Ραφαηλία Καρακίτσου

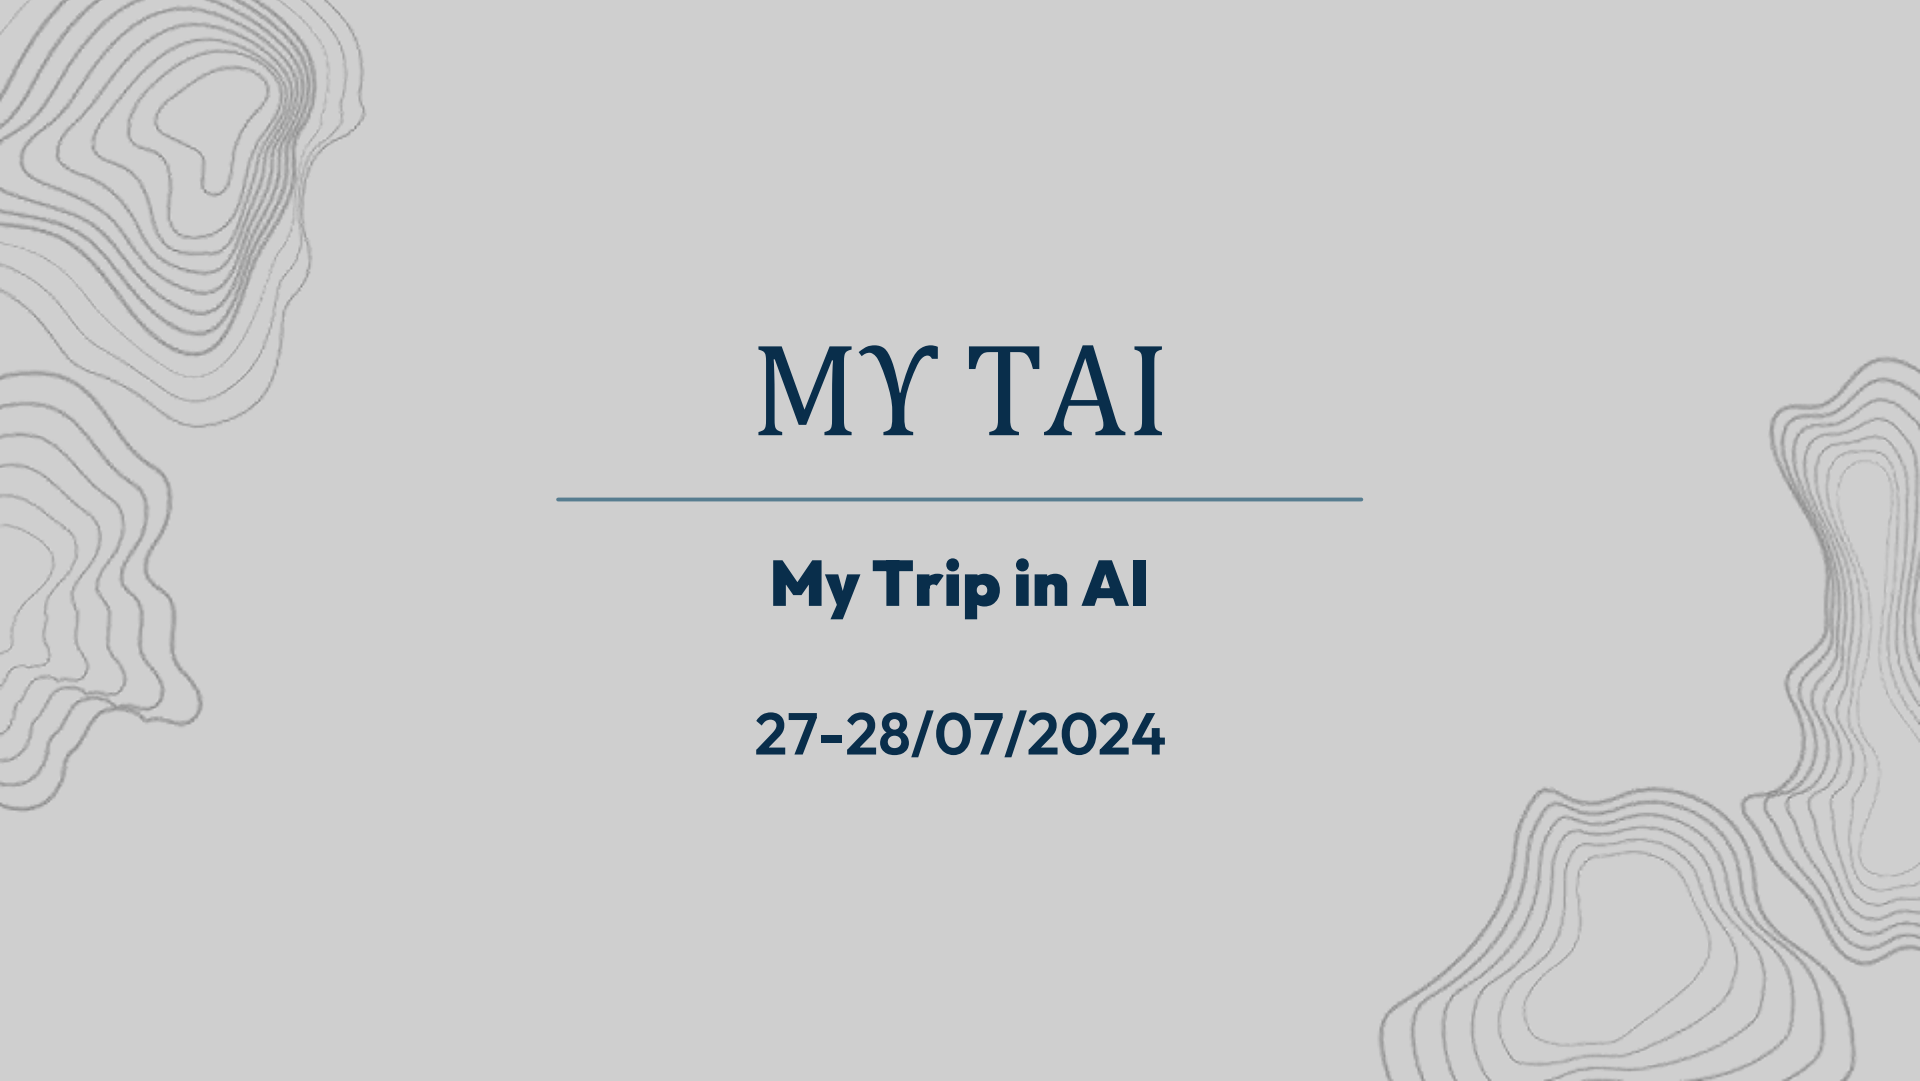

MY TAI

My Trip in AI

27-28/07/2024

ABOUT THE CONFERENCE

- Το συνέδριο αφορά την ενσωμάτωση και χρήση του AI στον τουρισμό. Φιλοξενεί εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη στον κλάδο του τουρισμού και έχουν να αναδείξουν καινοτόμα επιχειρηματικά σχέδια για το άμεσο μέλλον με την χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης.
- Το συνέδριο περιλαμβάνει ομιλίες και panel συζητήσεων από υψηλόβαθμα στελέχη που εκπροσωπούν τις εταιρείες. Παράλληλα, φιλοξενούνται εκθεσιακά περίπτερα που στοχεύουν στην εξατομικευμένη ενημέρωση των άμεσα ενδιαφερόμενων.

01

CONFERENCE GOALS

CONFERENCE GOALS

- Προσέγγιση τουλάχιστον 40 καινοτόμων εταιρειών από όλη την Ευρώπη
- Δημιουργία συνεργατικών δεσμών μεταξύ Ευρωπαϊκών και Ελληνικών εταιρειών εντός 6 μηνών μετά το συνέδριο
- Παρακολούθηση του συνεδρίου από τουλάχιστον 2000 ενδιαφερόμενους συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον 200 φοιτητών
- Επίτευξη 30% αύξησης στην εφαρμογή λύσεων AI μεταξύ των συμμετεχόντων στο συνέδριο εντός 18 μηνών μετά το συνέδριο
- Δημιουργία διαδικτυακής κοινότητας μετά το πέρας του συνεδρίου με τουλάχιστον 500 ενεργά μέλη εντός έξι μηνών, προωθώντας τη συνεχή συνεργασία για την τεχνητή νοημοσύνη στον

02

PROJECT SCOPE



IN

- Διαχείριση οικονομικών πόρων
- Οργάνωση και συντονισμός εθελοντών
- Δημιουργία γραφικού και βιντεο υλικού
- Συντονισμός την ημέρα του συνεδρίου
- Διαφημιστική καμπάνια προώθησης του συνεδρίου
- Παροχή πιστοποίησης παρακολούθησης
- Προστασία προσωπικών δεδομένων των παρουσιάσεων και των ομιλητών
- Διαμόρφωση κανόνων ομιλιών των εκπροσώπων των εταιρειών
- Οργάνωση panel συζητήσεων, ομιλιών
- Διαχείριση χορηγιών

OUT

- Οργάνωση και διαμόρφωση του χώρου των περιπτέρων για την διαφήμιση της κάθε εταιρείας
- Κάλυψη περαιτέρω δραστηριοτήτων των εκπροσώπων των εταιρειών
- Σύναψη πιθανών συνεργασιών μεταξύ των εταιρειών
- Συνεντεύξεις για εύρεση εργασίας στις συμμετέχουσες εταιρείες

A decorative topographic map pattern with concentric contour lines in a light gray color, located on the left side of the slide.

03

STAKEHOLDERS

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ



Η ομάδα έργου έρχεται σε επικοινωνία με τους προμηθευτές για την κάλυψη της διατροφής την ημέρα του συνεδρίου

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ



Οι εταιρείες υποστήριξης συνεισφέρουν στη διαφήμιση και προώθηση του συνεδρίου αλλά και σε ό,τι αφορά τον τεχνικό εξοπλισμό

ΧΟΡΗΓΟΙ



Οι χορηγοί προσφέρουν χρηματικά ποσά που καλύπτουν μεγάλο μέρος των εξόδων του συνεδρίου

ΟΜΑΔΕΣ ΧΡΗΣΤΩΝ




Η συντονιστική ομάδα έργου και οι εθελοντές είναι υπεύθυνοι για την ομαλή διεξαγωγή του συνεδρίου

A decorative background element on the left side of the slide, consisting of a series of concentric, wavy lines in a light gray color, resembling a topographic map or contour lines.


04


WBS- GANTT CHART

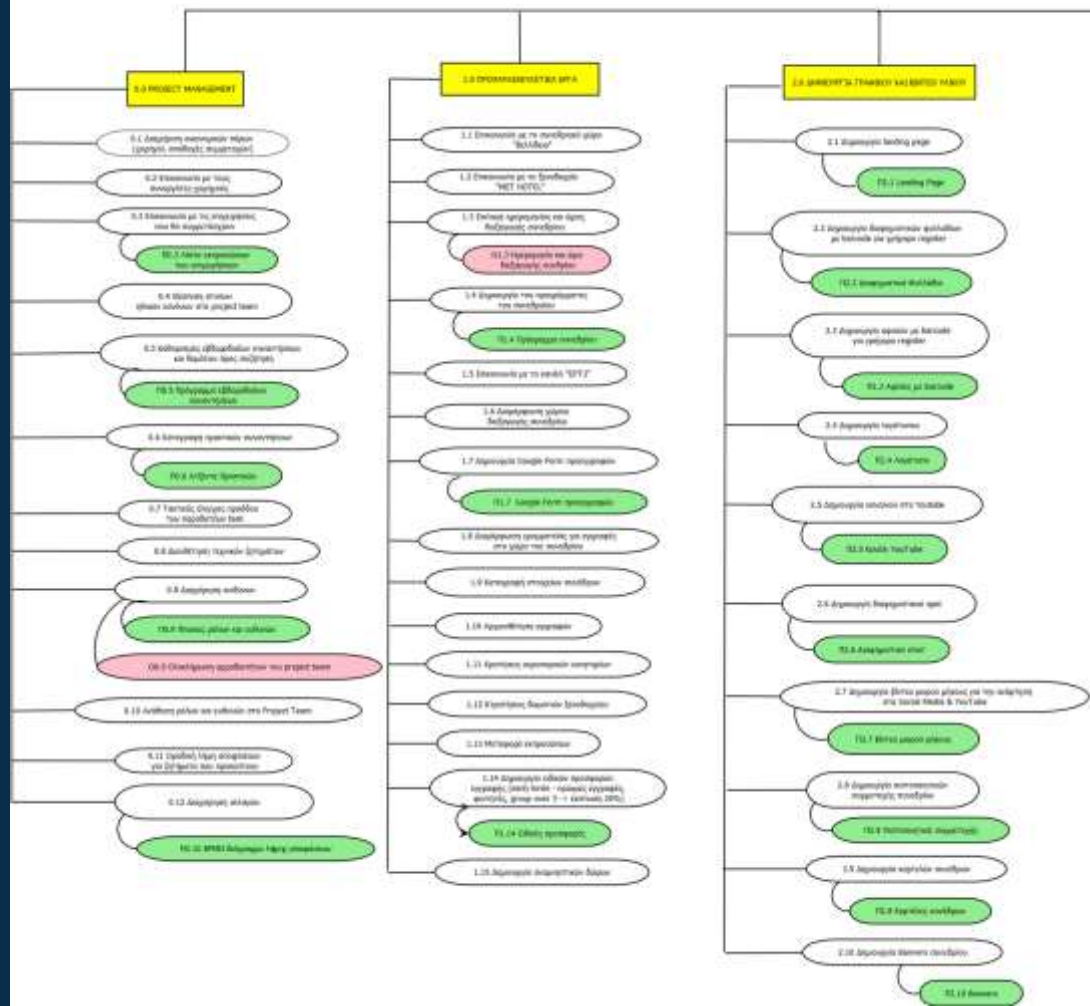

1	Start	0 days	Thu 18/4/24	Thu 18/4/24	
2	• ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ	36 days	Thu 18/4/24	Tue 11/6/24	
3	Επικοινωνία με το συνεδριακό χώρο "Βελλίδειο"	3 days	Thu 18/4/24	Mon 22/4/24 1	Public Relations Coordinator
4	Επιλογή ημερομηνίας και ώρας διεξαγωγής συνεδρίου	2 days	Tue 23/4/24	Wed 24/4/24 3	Project Manager
5	Επικοινωνία με το ξενοδοχείο "MET HOTEL"	3 days	Tue 14/5/24	Thu 16/5/24 4	Public Relations Coordinator
6	Δημιουργία του προγράμματος του συνεδρίου	3,5 days	Thu 25/4/24	Tue 30/4/24 3,4	Project Manager; Task Leader
7	Επικοινωνία με το κανάλι "EPT3"	3 days	Thu 9/5/24	Mon 13/5/24 3;4	Public Relations Coordinator
8	Διαμόρφωση χώρου διεξαγωγής συνεδρίου	0,67 days	Tue 30/4/24	Wed 1/5/24 3;6	Volunteers[1.500%]
9	Δημιουργία Google Form προεγγραφών	3 days	Tue 21/5/24	Fri 24/5/24 4;6	Task Leader
10	Διαμόρφωση γραμματείας για εγγραφές στον χώρο του συνεδρίου	0,17 days	Wed 1/5/24	Wed 1/5/24 8	Volunteers[1.200%]
11	Καταγραφή στοιχείων συνένδρων	0,29 days	Wed 1/5/24	Wed 1/5/24 10	Volunteers[700%]
12	Αρχειοθέτηση εγγραφών	1 day	Wed 1/5/24	Thu 2/5/24 10;11	Volunteers[300%]
13	Κρατήσεις αεροπορικών εισιτηρίων	3 days	Tue 30/4/24	Tue 28/5/24 4	Financial Manager
14	Κρατήσεις δωματίων ξενοδοχείου	2 days	Wed 29/5/24	Thu 30/5/24 5;4	Financial Manager
15	Μεταφορά εκπροσώπων	3 days	Fri 31/5/24	Tue 4/6/24 4;6	Financial Manager
16	Δημιουργία ειδικών προσφορών εγγραφής	5 days	Wed 5/6/24	Tue 11/6/24 9	Financial Manager
17	Δημιουργία αναμνηστικών/δώρων	1,38 days	Thu 18/4/24	Fri 19/4/24 1	Volunteers[800%]
18	Δημιουργία ερωτηματολογίου αξιολόγησης του συνεδρίου	6 days	Thu 2/5/24	Wed 15/5/24 11;12	Task Leader
19	• ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ ΥΛΙΚΟΥ	59 days	Thu 18/4/24	Mon 15/7/24	
20	Δημιουργία λογαυτίπου	4 days	Thu 18/4/24	Tue 23/4/24 1	Task Leader
21	Δημιουργία landing page	4 days	Wed 24/4/24	Mon 29/4/24 20	Financial Manager
22	Δημιουργία διαφημιστικών φυλλαδίων με barcode για γρήγορο register	8 days	Wed 1/5/24	Thu 20/6/24 20;21	Project Manager
23	Δημιουργία αφισών με barcode για γρήγορο register	12 days	Fri 24/5/24	Mon 10/6/24 20;21	Public Relations Coordinator
24	Δημιουργία καναλιού στο Youtube	2 days	Mon 29/4/24	Tue 30/4/24 20	Public Relations Coordinator
25	Δημιουργία διαφημιστικού spot	15 days	Wed 1/5/24	Fri 24/5/24 24	Financial Manager
26	Αξιολόγηση διαφημιστικού spot από το τηλεοπτικό κανάλι EPT3	5 days	Tue 9/7/24	Mon 15/7/24 25	Project Manager
27	Δημιουργία βίντεο μικρού μήκους για την ανάρτηση στα social media και στο YouTube	2,8 days	Wed 1/5/24	Wed 8/5/24 24	Volunteers[500%]
28	• ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ	61 days	Tue 23/4/24	Mon 22/7/24	
29	Δημιουργία λογαριασμών στα social media platforms(Facebook, Instagram, LinkedIn)	3 days	Wed 24/4/24	Fri 26/4/24 20	Public Relations Coordinator
30	Ανακοίνωση διεξαγωγής συνεδρίου	1 day	Tue 30/4/24	Wed 1/5/24 29	Project Manager
31	Αναζήτηση και εύρεση επώνυμων επιχειρηματιών	4 days	Tue 23/4/24	Wed 8/5/24 1	Public Relations Coordinator
32	Επικοινωνία με αναγνωρίσιμους επαγγελματίες του κλάδου	10 days	Thu 23/5/24	Wed 5/6/24 31	Project Manager
33	Δημιουργία λίστας email με πιθανούς ενδιαφερόμενους	0,6 days	Thu 6/6/24	Thu 6/6/24 32	Volunteers[1.000%]

34	Προώθηση ενημερωτικού υλικού στους ενδιαφερόμενους	4 days	Wed 3/7/24	Mon 8/7/24	33	Project Manager
35	Αποστολή διαφημιστικού spot στο τηλεοπτικό κανάλι EPT3 (χορηγός)	5 days	Tue 16/7/24	Mon 22/7/24	25	Project Manager
36	Ανάρτηση διαφημιστικών βίντεο στα Social Media και στο YouTube	0,88 days	Wed 8/5/24	Thu 9/5/24	24,27,29	Volunteers[800%]
37	• ΕΥΡΕΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ	26,12 days	Mon 29/4/24	Fri 7/6/24		
38	Δημόσια ανάρτηση για την εύρεση εθελοντών	3 days	Mon 29/4/24	Wed 1/5/24	29	Volunteer Coordinator
39	Διαδικτυακή συνέντευξη με τους υποψήφιους εθελοντές	4,5 days	Thu 2/5/24	Mon 13/5/24	38	Volunteer Coordinator,Project Manager
40	Επιλογή εθελοντών	2,5 days	Mon 13/5/24	Wed 15/5/24	39	Volunteer Coordinator,Project Manager
41	Ανάθεση ρόλων στους εθελοντές	8 days	Thu 16/5/24	Mon 27/5/24	40	Volunteer Coordinator
42	Training εθελοντών	8,12 days	Tue 28/5/24	Fri 7/6/24	41	Volunteer Coordinator,Task Leader
43	• ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ & ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ	46 days	Wed 24/4/24	Tue 2/7/24		
44	Έλεγχος σωστής λειτουργίας τεχνικού εξοπλισμού	3 days	Wed 24/4/24	Thu 2/5/24	1	Task Leader
45	Εξασφάλιση καθαριότητας και οργάνωσης χώρου συνεδρίου	4 days	Wed 15/5/24	Tue 21/5/24	44	Task Leader
46	Εξασφάλιση παρουσίας τεχνικών	3 days	Thu 6/6/24	Mon 10/6/24	45	Project Manager
47	Εξασφάλιση πρόσβασης σε πρώτες βοήθειες και εξοπλισμό έκτακτης ανάγκης	2 days	Wed 12/6/24	Fri 14/6/24	30	Task Leader
48	Παρακολούθηση της τήρησης του χρονοδιαγράμματος	4 days	Thu 27/6/24	Tue 2/7/24	46	Project Manager
49	Συντονισμός των ομιλητών	1,25 days	Thu 2/5/24	Wed 8/5/24	44	Volunteers[400%]
50	Διεξαγωγή ομιλιών και panel συζητήσεων	0,6 days	Wed 8/5/24	Thu 9/5/24	6,8,49	Speakers[1.500%]
51	Παροχή βοήθειας και καθοδήγησης για τους ομιλητές και τους συμμετέχοντες	0,67 days	Fri 7/6/24	Fri 7/6/24	42,49	Volunteers[600%]
52	Παρακολούθηση και ενημέρωση των κοινωνικών δικτύων με συνεχείς αναρτήσεις	5 days	Fri 17/5/24	Thu 23/5/24	29	Public Relations Coordinator
53	Παράδοση υλικού στους συνέδρους	3 days	Tue 25/6/24	Fri 28/6/24	17,41	Task Leader
54	Φωτογραφική κάλυψη και βιντεοσκόπηση συνεδρίου	3 days	Tue 11/6/24	Thu 13/6/24	7,24,41	Public Relations Coordinator
55	Πρακτικογράφηση συνεδρίου	5 days	Thu 16/5/24	Wed 22/5/24	11,12,18	Project Manager
56	Οργάνωση συνέντευξης τύπου λήξης συνεδρίου	3 days	Fri 7/6/24	Wed 12/6/24	7	Task Leader
57	Οργάνωση ομάδας security	6 days	Fri 14/6/24	Tue 25/6/24	3,4,6	Task Leader
58	• ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ	22,38 days	Fri 24/5/24	Wed 26/6/24		
59	Αποστολή ερωτηματολογίων σε όλους τους συμμετέχοντες	3 days	Fri 24/5/24	Wed 29/5/24	55	Task Leader
60	Επεξεργασία αποτελεσμάτων των ερωτηματολογίων	0,57 days	Wed 29/5/24	Thu 30/5/24	59	Volunteers[700%]
61	Εξαγωγή στατιστικών στοιχείων σχετικά με την επιτυχία του συνεδρίου	7 days	Wed 12/6/24	Wed 26/6/24	60	Financial Manager,Project Manager
62	Finish	0 days	Mon 22/7/24	Mon 22/7/24	22,23,34,35,36,42,47,48,49;	

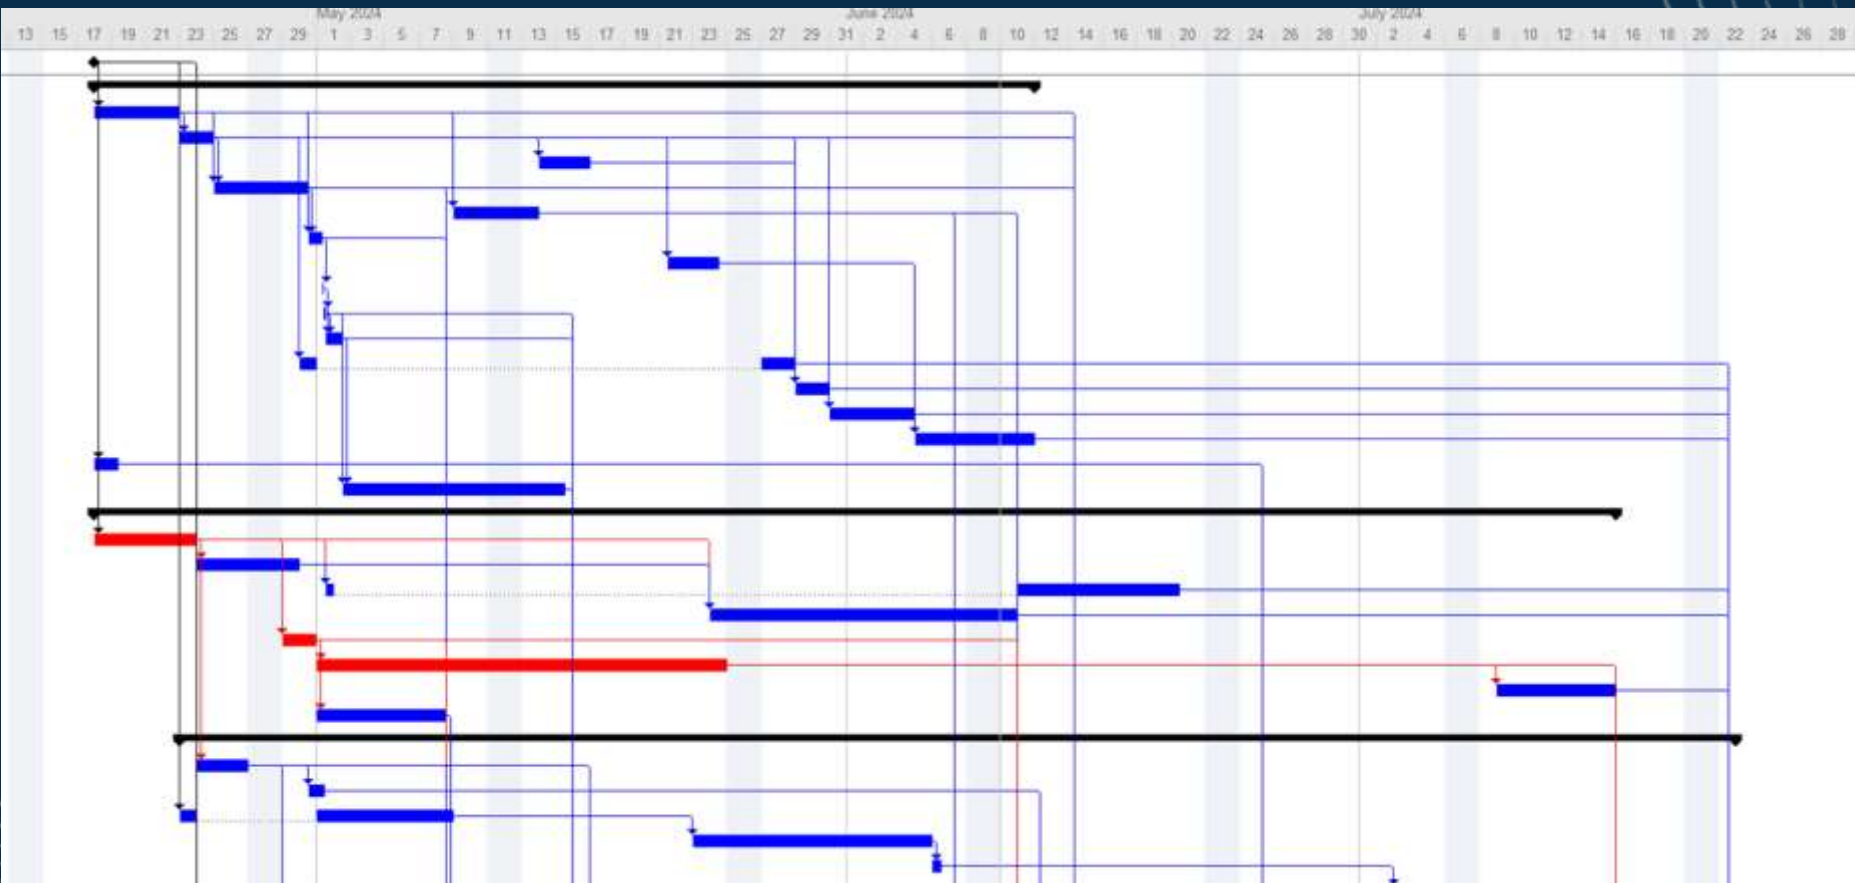

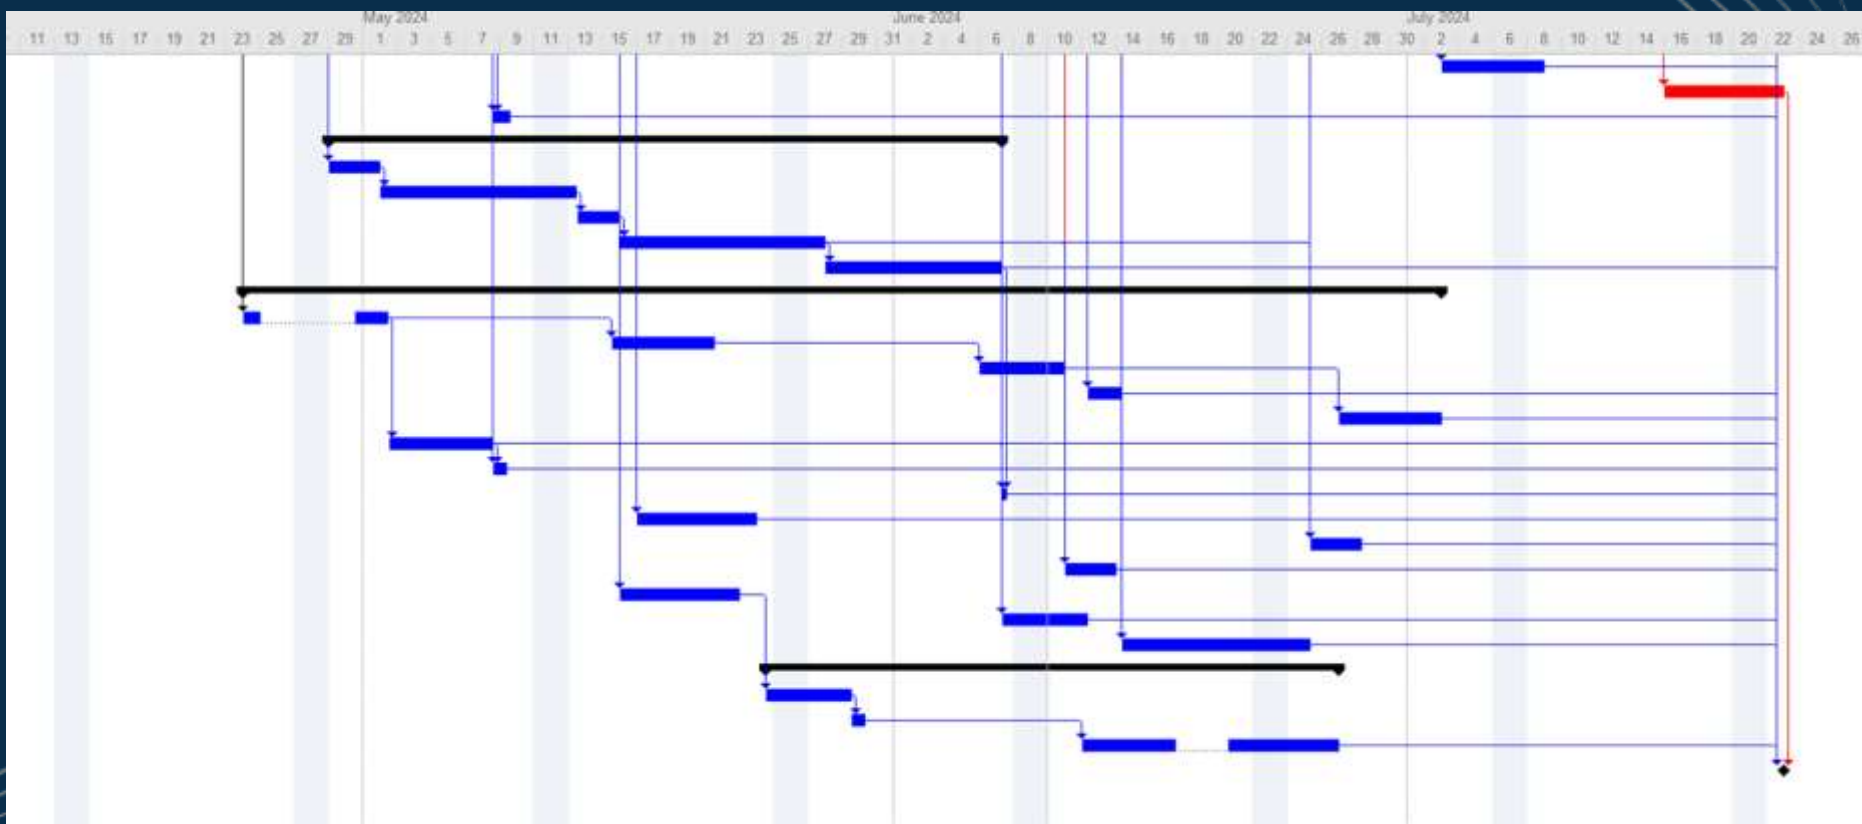

VOLUNTEERS

Η διαδικασία εύρεσης και οργάνωσης εθελοντών από την ομάδα έργου:



05

RESOURCES





Πριν την εξομάλυνση πόρων

	i	Resource Name	Type	Material	Initials	Group	Max.	Std. Rate	Ovt. Rate	Cost/Use	Accrue	Base
1		Project Manager	Work		PM		100%	20,00 €/hr	25,00 €/hr	0,00 €	Prorated	MyCalendar
2		Financial Manager	Work		FM		100%	18,00 €/hr	23,00 €/hr	0,00 €	Prorated	MyCalendar
3		Public Relations Coordinator	Work		PR		100%	15,00 €/hr	20,00 €/hr	0,00 €	Prorated	MyCalendar
4		Task Leader	Work		TL		100%	17,00 €/hr	22,00 €/hr	0,00 €	Prorated	MyCalendar
5		Volunteer Coordinator	Work		VC		100%	15,00 €/hr	20,00 €/hr	0,00 €	Prorated	MyCalendar
6		Volunteers	Work		V		4.000%	0,00 €/hr	0,00 €/hr	0,00 €	Prorated	MyCalendar
7		Speakers	Work		S		2.000%	0,00 €/hr	0,00 €/hr	0,00 €	Prorated	MyCalendar

Μετά την εξομάλυνση πόρων

	i	Resource Name	Type	Material	Initials	Group	Max.	Std. Rate	Ovt. Rate	Cost/Use	Accrue	Base
1		Project Manager	Work		PM		100%	20,00 €/hr	25,00 €/hr	0,00 €	Prorated	MyCalendar
2		Financial Manager	Work		FM		100%	18,00 €/hr	23,00 €/hr	0,00 €	Prorated	MyCalendar
3		Public Relations Coordinator	Work		PR		100%	15,00 €/hr	20,00 €/hr	0,00 €	Prorated	MyCalendar
4		Task Leader	Work		TL		100%	17,00 €/hr	22,00 €/hr	0,00 €	Prorated	MyCalendar
5		Volunteer Coordinator	Work		VC		100%	15,00 €/hr	20,00 €/hr	0,00 €	Prorated	MyCalendar
6		Volunteers	Work		V		4.000%	0,00 €/hr	0,00 €/hr	0,00 €	Prorated	MyCalendar
7		Speakers	Work		S		2.000%	0,00 €/hr	0,00 €/hr	0,00 €	Prorated	MyCalendar

Πριν την εξομάλυνση πόρων

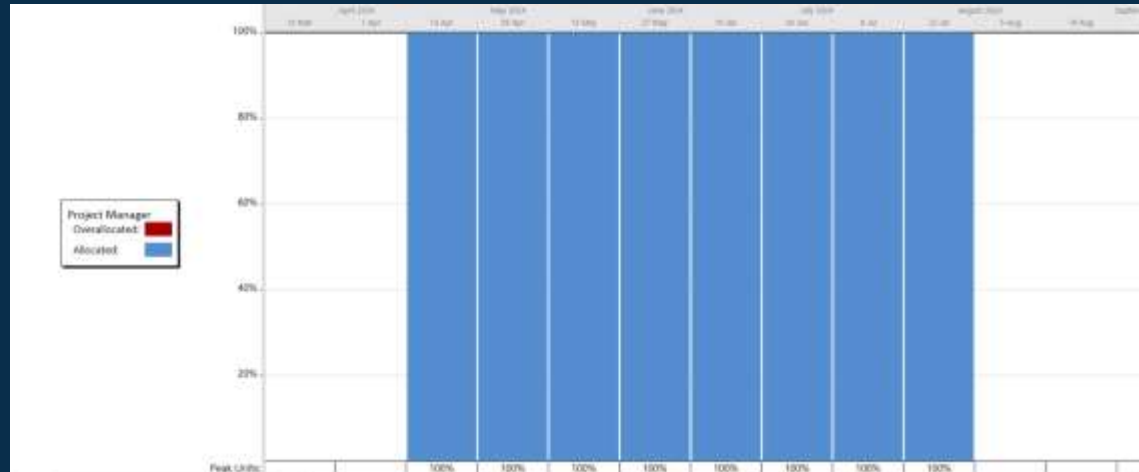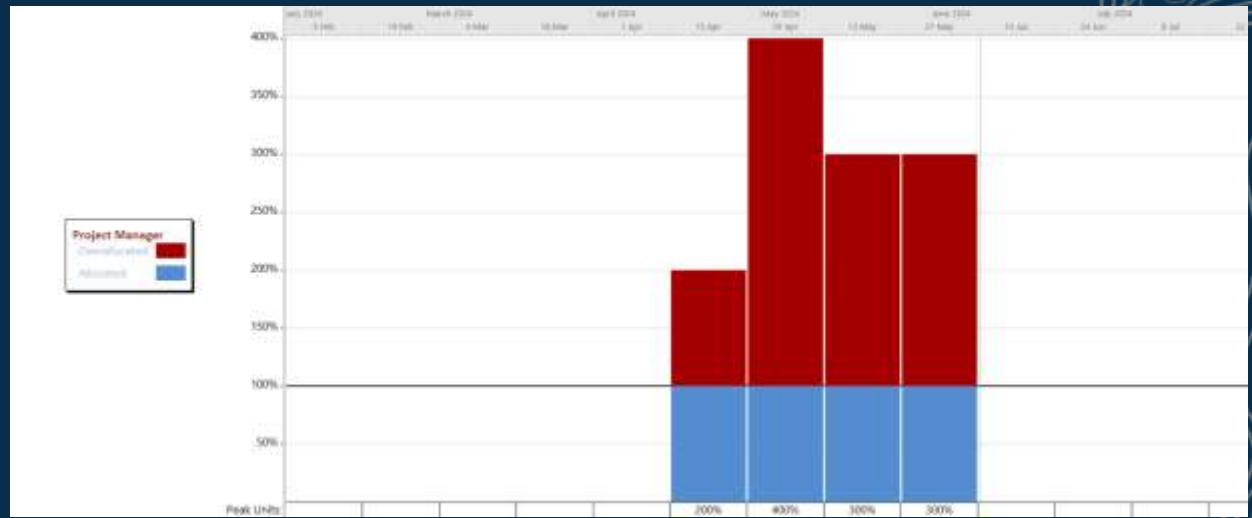

Μετά την εξομάλυνση
πόρων

A decorative topographic map pattern with concentric contour lines in a light gray color, located on the left side of the page.

06

COSTS

	Task Name ▼	Fixed ▼	Fixed Cost ▼	Total ▼	Baseline ▼	Variance ▼	Actual ▼	Remaining ▼
1	Start	0,00 €	Prorated	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	▲ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ	0,00 €	Prorated	5.532,00 €	0,00 €	5.532,00 €	0,00 €	5.532,00 €
3	Επικοινωνία με το συνεδριακό χώρο “Βελλίδειο”	0,00 €	Prorated	360,00 €	0,00 €	360,00 €	0,00 €	360,00 €
4	Επιλογή ημερομηνίας και ώρας διεξαγωγής συνεδρίου	0,00 €	Prorated	320,00 €	0,00 €	320,00 €	0,00 €	320,00 €
5	Επικοινωνία με το ξενοδοχείο “MET HOTEL”	0,00 €	Prorated	360,00 €	0,00 €	360,00 €	0,00 €	360,00 €
6	Δημιουργία του προγράμματος του συνεδρίου	0,00 €	Prorated	1.036,00 €	0,00 €	1.036,00 €	0,00 €	1.036,00 €
7	Επικοινωνία με το κανάλι “ΕΡΤ3”	0,00 €	Prorated	360,00 €	0,00 €	360,00 €	0,00 €	360,00 €
8	Διαμόρφωση χώρου διεξαγωγής συνεδρίου	0,00 €	Prorated	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	Δημιουργία Google Form προεγγραφών	0,00 €	Prorated	408,00 €	0,00 €	408,00 €	0,00 €	408,00 €
10	Διαμόρφωση γραμματείας για εγγραφές στον χώρο του συνεδρίου	0,00 €	Prorated	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	Καταγραφή στοιχείων συνέδρων	0,00 €	Prorated	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Αρχειοθέτηση εγγραφών	0,00 €	Prorated	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	Κρατήσεις αεροπορικών εισιτηρίων	0,00 €	Prorated	432,00 €	0,00 €	432,00 €	0,00 €	432,00 €
14	Κρατήσεις δωματίων ξενοδοχείου	0,00 €	Prorated	288,00 €	0,00 €	288,00 €	0,00 €	288,00 €
15	Μεταφορά εκπροσώπων	0,00 €	Prorated	432,00 €	0,00 €	432,00 €	0,00 €	432,00 €
16	Δημιουργία ειδικών προσφορών εγγραφής	0,00 €	Prorated	720,00 €	0,00 €	720,00 €	0,00 €	720,00 €
17	Δημιουργία αναμνηστικών/δώρων	0,00 €	Prorated	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18	Δημιουργία ερωτηματολογίου αξιολόγησης του συνεδρίου	0,00 €	Prorated	816,00 €	0,00 €	816,00 €	0,00 €	816,00 €
19	▲ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ ΥΛΙΚΟΥ	0,00 €	Prorated	7.040,00 €	0,00 €	7.040,00 €	0,00 €	7.040,00 €
20	Δημιουργία λογοτύπου	0,00 €	Prorated	544,00 €	0,00 €	544,00 €	0,00 €	544,00 €
21	Δημιουργία landing page	0,00 €	Prorated	576,00 €	0,00 €	576,00 €	0,00 €	576,00 €

	Task Name ▼	Fixed ▼	Fixed Cost ▼	Total ▼	Baseline ▼	Variance ▼	Actual ▼	Remaining ▼
22	Δημιουργία διαφημιστικών φυλλαδίων με barcode για γρήγορο register	0,00 €	Prorated	1.280,00 €	0,00 €	1.280,00 €	0,00 €	1.280,00 €
23	Δημιουργία αφισών με barcode για γρήγορο register	0,00 €	Prorated	1.440,00 €	0,00 €	1.440,00 €	0,00 €	1.440,00 €
24	Δημιουργία καναλιού στο Youtube	0,00 €	Prorated	240,00 €	0,00 €	240,00 €	0,00 €	240,00 €
25	Δημιουργία διαφημιστικού spot	0,00 €	Prorated	2.160,00 €	0,00 €	2.160,00 €	0,00 €	2.160,00 €
26	Αξιολόγηση διαφημιστικού spot από το τηλεοπτικό κανάλι EPT3	0,00 €	Prorated	800,00 €	0,00 €	800,00 €	0,00 €	800,00 €
27	Δημιουργία βίντεο μικρού μήκους για την ανάρτηση στα social media και στο YouTube	0,00 €	Prorated	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
28	ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ	0,00 €	Prorated	4.040,00 €	0,00 €	4.040,00 €	0,00 €	4.040,00 €
29	Δημιουργία λογαριασμών στα social media platforms(Facebook, Instagram, LinkedIn)	0,00 €	Prorated	360,00 €	0,00 €	360,00 €	0,00 €	360,00 €
30	Ανακοίνωση διεξαγωγής συνεδρίου	0,00 €	Prorated	160,00 €	0,00 €	160,00 €	0,00 €	160,00 €
31	Αναζήτηση και εύρεση επώνυμων επιχειρηματιών	0,00 €	Prorated	480,00 €	0,00 €	480,00 €	0,00 €	480,00 €
32	Επικοινωνία με αναγνωρίσιμους επαγγελματίες του κλάδου	0,00 €	Prorated	1.600,00 €	0,00 €	1.600,00 €	0,00 €	1.600,00 €
33	Δημιουργία λίστας email με πιθανούς ενδιαφερόμενους	0,00 €	Prorated	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
34	Πρώθηση ενημερωτικού υλικού στους ενδιαφερόμενους	0,00 €	Prorated	640,00 €	0,00 €	640,00 €	0,00 €	640,00 €
35	Αποστολή διαφημιστικού spot στο τηλεοπτικό κανάλι EPT3 (χορηγός)	0,00 €	Prorated	800,00 €	0,00 €	800,00 €	0,00 €	800,00 €
36	Ανάρτηση διαφημιστικών βίντεο στα Social Media και στο YouTube	0,00 €	Prorated	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
37	ΕΥΡΕΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ	0,00 €	Prorated	4.944,00 €	0,00 €	4.944,00 €	0,00 €	4.944,00 €
38	Δημόσια ανάρτηση για την εύρεση	0,00 €	Prorated	360,00 €	0,00 €	360,00 €	0,00 €	360,00 €

	Task Name ▼	Fixed ▼	Fixed Cost ▼	Total ▼	Baseline ▼	Variance ▼	Actual ▼	Remaining ▼
39	Διαδικτυακή συνέντευξη με τους υποψήφιους εθελοντές	0,00 €	Prorated	1.260,00 €	0,00 €	1.260,00 €	0,00 €	1.260,00 €
40	Επιλογή εθελοντών	0,00 €	Prorated	700,00 €	0,00 €	700,00 €	0,00 €	700,00 €
41	Ανάθεση ρόλων στους εθελοντές	0,00 €	Prorated	960,00 €	0,00 €	960,00 €	0,00 €	960,00 €
42	Training εθελοντών	0,00 €	Prorated	1.664,00 €	0,00 €	1.664,00 €	0,00 €	1.664,00 €
43	4 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ & ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ	0,00 €	Prorated	5.736,00 €	0,00 €	5.736,00 €	0,00 €	5.736,00 €
44	Έλεγχος σωστής λειτουργίας τεχνικού εξοπλισμού	0,00 €	Prorated	408,00 €	0,00 €	408,00 €	0,00 €	408,00 €
45	Εξασφάλιση καθαριότητας και οργάνωσης χώρου συνεδρίου	0,00 €	Prorated	544,00 €	0,00 €	544,00 €	0,00 €	544,00 €
46	Εξασφάλιση παρουσίας τεχνικών	0,00 €	Prorated	480,00 €	0,00 €	480,00 €	0,00 €	480,00 €
47	Εξασφάλιση πρόσβασης σε πρώτες βοήθειες και εξοπλισμό έκτακτης ανάγκης	0,00 €	Prorated	272,00 €	0,00 €	272,00 €	0,00 €	272,00 €
48	Παρακολούθηση της τήρησης του χρονοδιαγράμματος	0,00 €	Prorated	640,00 €	0,00 €	640,00 €	0,00 €	640,00 €
49	Συντονισμός των ομιλητών	0,00 €	Prorated	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
50	Διεξαγωγή ομιλιών και panel συζητήσεων	0,00 €	Prorated	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
51	Παροχή βοήθειας και καθοδήγησης για τους ομιλητές και τους συμμετέχοντες	0,00 €	Prorated	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
52	Παρακολούθηση και ενημέρωση των κοινωνικών δικτύων με συνεχείς αναρτήσεις	0,00 €	Prorated	600,00 €	0,00 €	600,00 €	0,00 €	600,00 €
53	Παράδοση υλικού στους συνέδρους	0,00 €	Prorated	408,00 €	0,00 €	408,00 €	0,00 €	408,00 €
54	Φωτογραφική κάλυψη και βιντεοσκόπηση συνεδρίου	0,00 €	Prorated	360,00 €	0,00 €	360,00 €	0,00 €	360,00 €
55	Πρακτικογράφηση συνεδρίου	0,00 €	Prorated	800,00 €	0,00 €	800,00 €	0,00 €	800,00 €
56	Οργάνωση συνέντευξης τύπου λήξης	0,00 €	Prorated	408,00 €	0,00 €	408,00 €	0,00 €	408,00 €

57	Οργάνωση ομάδας security	0,00 €	Prorated	816,00 €	0,00 €	816,00 €	0,00 €	816,00 €
58	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ	0,00 €	Prorated	1.472,00 €	0,00 €	1.472,00 €	0,00 €	1.472,00 €
59	Αποστολή ερωτηματολογίων σε όλους τους συμμετέχοντες	0,00 €	Prorated	408,00 €	0,00 €	408,00 €	0,00 €	408,00 €
60	Επεξεργασία αποτελεσμάτων των ερωτηματολογίων	0,00 €	Prorated	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
61	Εξαγωγή στατιστικών στοιχείων σχετικά με την επιτυχία του συνεδρίου	0,00 €	Prorated	1.064,00 €	0,00 €	1.064,00 €	0,00 €	1.064,00 €
62	Finish	0,00 €	Prorated	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Project Statistics for 'finalwbs'

	Start	Finish
Current	Thu 18/4/24	Mon 22/7/24
Baseline	NA	NA
Actual	NA	NA
Variance	0d	0d

	Duration	Work	Cost
Current	64d	2.264h	28.764,00 €
Baseline	0d	0h	0,00 €
Actual	0d	0h	0,00 €
Remaining	64d	2.264h	28.764,00 €

Percent complete:

Duration: 0%

Work: 0%

Close

A decorative background element on the left side of the slide, consisting of a series of concentric, wavy lines in a light gray color, resembling a topographic map or a stylized profile of a head.

07

RISK MANAGEMENT PLAN

α/α	Κίνδυνος	Πιθανότητα (1-10)	Αντίκτυπος (1-10)	Σύνολο	Πλάνο για να αποτραπεί ο κίνδυνος	Πλάνο εάν ο κίνδυνος πραγματοποιηθεί
1	Φωτιά κατα τη διεξαγωγή του συνεδρίου	2	5= critical	10	Έλεγχος του χώρου και των ηλεκτρολογικών συστημάτων για την σωστή λειτουργία τους και εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισμού πυρόσβεσης	Θα εφαρμοστεί το σχέδιο εκκένωσης και θα κληθεί η πυροσβεστική
2	Αναφορά σε θεματικές εκτός πλαισίου κατα τη διάρκεια μιας ομιλίας	2	3= major	6	Χρειάζεται σωστή ενημέρωση όλων των ομιλητών σχετικά με τα θέματα που μπορούν να διαπραγματευτούν και τα όρια που θέτουμε ως ομάδα έργου σχετικά με ζητήματα φυλετικών και εθνικών διακρίσεων	Σε περίπτωση πραγματοποίησης του κινδύνου είναι αναγκαία η διακοπή της ομιλίας
3	Ακύρωση χορηγίας	2	2 = low	4	Συχνή επικοινωνία με τους χορηγούς απο τον Public Relationships Coordinator και τον Financial Manager	Ο Financial Manager να προσδιορίσει ξανά τον οικονομικό προϋπολογισμό και να προβεί στην κατάλληλη επιλογή ενός άλλου χορηγού

4	Απρόοπτα τεχνικά ζητήματα	4	2 = low	8	Ο σωστός έλεγχος όλων των τεχνολογικών συστημάτων πριν την έναρξη του συνεδρίου καθώς και η διεξαγωγή πρόβας για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας όλων των συστημάτων	Η έγκαιρη ενημέρωση του Technical Manager από κάποιον εθελοντή και η άμεση αποκατάσταση του προβλήματος
5	Αποχώρηση μέλους της ομάδας έργου	2	4= severe	8	Η διασφάλιση της ενεργούς συμμετοχής της ομάδας έργου και ο σεβασμός των διαφορετικών απόψεων όλων των μελών για να αποφευχθούν τυχόν συγκρούσεις	Ο Project Manager να αναλάβει την ανάθεση των αρμοδιοτήτων στα υπόλοιπα μέλη από την αρχή, ώστε να καλυφθεί γρήγορα το κενό

08

APPS



APPS



DISCORD

Για την διαδικτυακή επικοινωνία μεταξύ των μελών της ομάδας



GOOGLE DRIVE

Για την επεξεργασία και τον διαμοιρασμό αρχείων



MICROSOFT PROJECT

Για την κατασκευή του Gantt Chart και τον χρονοπρογραμματισμό του έργου




ASANA

Για την οργάνωση των συναντήσεων της ομάδας έργου

09

BPMN DIAGRAM

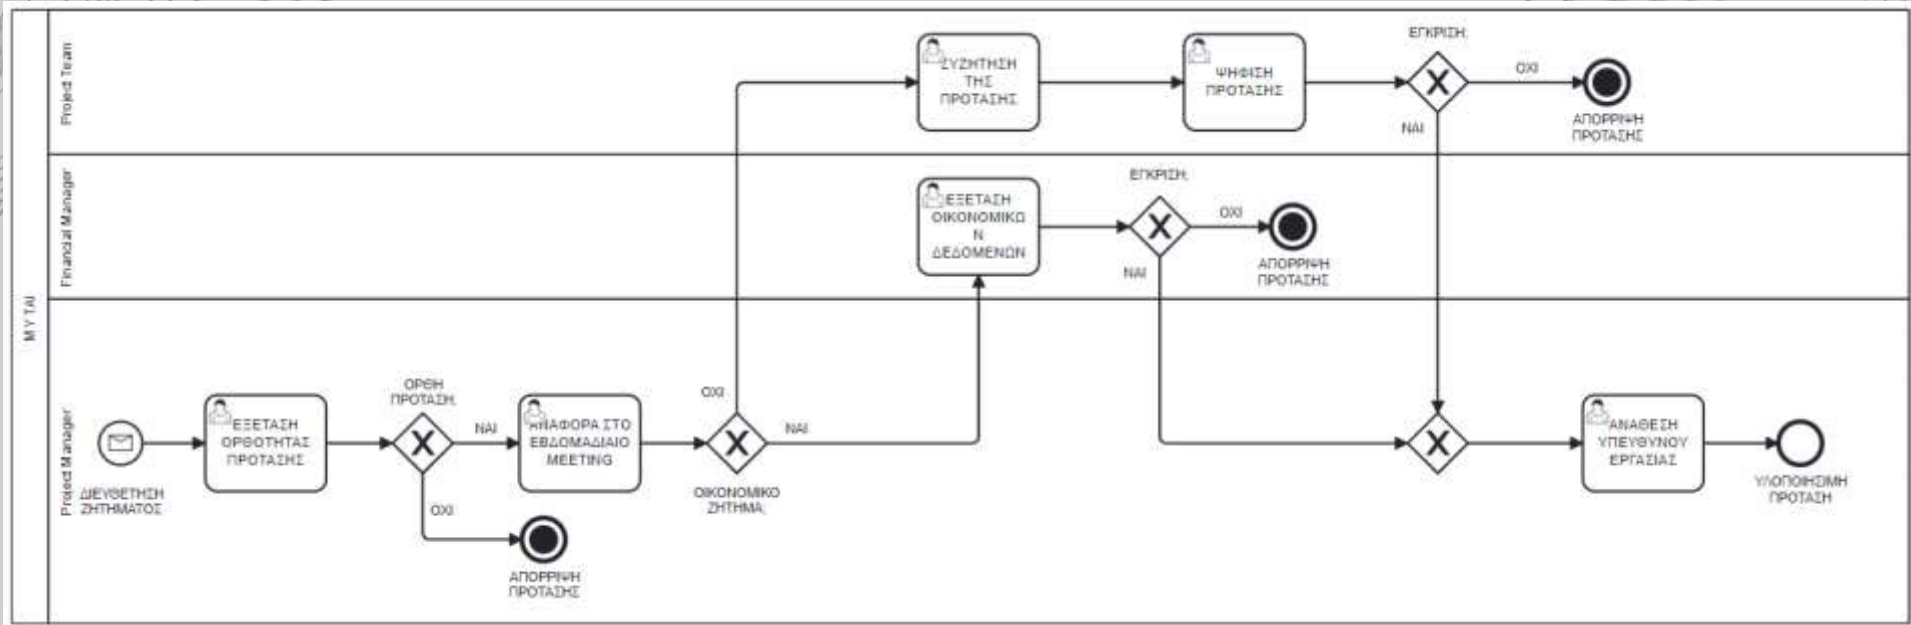

10

PROBLEMS & LESSONS LEARNED

PROBLEMS & LESSONS LEARNED

Συντονισμός και εύρεση ημερομηνιών

Η εύρεση της κατάλληλης ημερομηνίας ώστε να είναι διαθέσιμοι όλοι οι ομιλητές, ο χώρος που θα καλύπτει την αναγκαία χωρητικότητα αλλά και το κατάλυμα που θα φιλοξενήσει τους προσκεκλημένους θα μπορούσε να αποτελεί ένα πιθανό πρόβλημα, το οποίο όμως έχει αναλάβει εξ αρχής ο Public Relations Coordinator με αποτέλεσμα να επιλέξει τον χρόνο και τόπο διεξαγωγής ώστε να είναι όλοι διαθέσιμοι.

Προμήθειες

Η καθυστέρηση των προμηθειών την ημέρα του συνεδρίου λόγω π.χ. μη διαθεσιμότητας του οδηγού θα μπορούσε να αποτελεί ένα πιθανό πρόβλημα, το οποίο η ομάδα έργου έχει προβλέψει με την χρήση προσωπικού οχήματος για την μεταφορά και την παράδοση των προμηθειών εγκαίρως στο συνεδριακό χώρο.

CONCLUSION

Η οργάνωση ενός συνεδρίου μπορεί να ενέχει διάφορα προβλήματα και κινδύνους που πρέπει να ληφθούν υπόψη για να εξασφαλιστεί η επιτυχία του.

Για την αποφυγή ή την ελαχιστοποίηση αυτών των κινδύνων, είναι σημαντικό να γίνει προσεκτικός προγραμματισμός και να υπάρχουν εναλλακτικά σχέδια (π.χ. σχέδιο έκτακτης ανάγκης), επαρκής επικοινωνία με όλους τους εμπλεκόμενους και τακτική ανασκόπηση της προόδου και των διαδικασιών.



THANK YOU!

mytai@uom.edu.gr
MyTAI.com
