



ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΙ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

Αριθμός/Κωδικός Παραδοτέου: 0.1

Interim Baseline Report

Συγγραφική Ομάδα:	Οργανωτική Ομάδα Συνεδρίου
Υπεύθυνος:	Λιάμα Παρασκευή
Έκδοση:	0.1
Ημερομηνία:	18-04-2024
Τύπος παραδοτέου:	Ενδιάμεση υποβολή

Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 2024

Ομάδα Έργου

	Ρόλος	Όνομα
1.	Project Manager	Λιάμα Παρασκευή
2.	Υπεύθυνος Ελέγχου Παραδοτέων, Public Relations Coordinator	Κοντοπούλου Μαρία-Μαρίνα
3.	Task Leader, PMO Director	Κούβαρος Ιωάννης
4.	Volunteer Coordinator	Καρακίτσου Ραφαηλία
5.	Financial Manager, Technical Manager	Λάμπρογλου Γεώργιος

Ιστορικό Αναθεώρησης

Έκδοση	Ημερομηνία	Υπεύθυνος	Περιγραφή
Version 1	18-04-2024	Λιάμα Παρασκευή	Εκκίνηση συγγραφής της αναφοράς Interim Baseline Report

Πίνακας περιεχομένων

ΟΜΑΔΑ ΈΡΓΟΥ	2
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	3
ΛΙΣΤΑ ΠΙΝΑΚΩΝ	5
ΛΙΣΤΑ ΕΙΚΟΝΩΝ	6
ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ	7
1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ	8
1.1 ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ	8
1.2 ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ	8
2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΈΡΓΟΥ	10
2.1 ΕΥΡΟΣ ΈΡΓΟΥ	10
2.2 ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΈΡΓΟ	11
2.3 ΣΤΟΧΟΙ ΈΡΓΟΥ	12
2.4 PROJECT CHARTER – ΧΑΡΤΗΣ ΈΡΓΟΥ	13
2.5 ΠΛΑΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ	13
2.5.1 Πλάνο Επικοινωνίας – Project Communication Plan	13
2.6 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ	15
2.6.1 Ατζέντα 1ης συνάντησης	15
2.6.2 Πρακτικά 1ης συνάντησης	16
2.6.3 Ατζέντα 5ης συνάντησης	17
2.6.4 Πρακτικά 5ης συνάντησης	17
2.6.5 Ατζέντα 8ης συνάντησης	18
2.6.6 Πρακτικά 8ης συνάντησης	19
2.7 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	21
2.7.1 Εφαρμογές για την επικοινωνία μεταξύ των μελών	21
2.7.2 Εφαρμογές για την επεξεργασία και τον διαμοιρασμό αρχείων	21
2.7.3 Εφαρμογές για τον οργάνωση του συνεδρίου	21
2.7.4 Εφαρμογές για την οργάνωση των ομαδικών συναντήσεων	21
2.8 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ	23
2.8.1 Ανάλυση BPMN διαγράμματος	24
2.9 ΔΟΜΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΈΡΓΟΥ (ΔΑΕ-WBS)	25
2.9.1 Ανάλυση WBS	26
2.10 ΛΙΣΤΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΟΣΗΜΩΝ	27
2.10.1 Λίστα Παραδοτέων	27
2.10.2 Λίστα Οροσλήμων	28
2.11 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ GANTT	29
3 ΠΗΓΕΣ	31

Λίστα Πινάκων

Πίνακας 1: Εύρος Έργου

Πίνακας 2: Χάρτης Έργου – Project Charter

Πίνακας 3: Πλάνο Επικοινωνίας – Communication Plan

Πίνακας 4: Λίστα Παραδοτέων

Πίνακας 5: Λίστα Οροσήμων

Λίστα Εικόνων

Εικόνα 1: Παράδειγμα χρήσης Asana

Εικόνα 2: Διαδικασία λήψης αποφάσεων

Εικόνα 3: Δομή Ανάλυσης Έργου (WBS)

Εικόνα 4: Διάγραμμα Gantt

Επιτελική Σύνοψη

Σε αυτό το έγγραφο αναλύεται η οργάνωση και η διεξαγωγή του συνεδρίου που έχει αναλάβει η ομάδα έργου. Επιπλέον έμφαση δίνεται στον σκοπό του συνεδρίου, στους στόχους καθώς και στον χρονοπρογραμματισμό. Επίσης, αναλύεται το εύρος του και παρουσιάζεται το project charter που προσδιορίζει τα όρια του έργου. Η ομάδα ακολουθεί ένα συγκεκριμένο πλάνο επικοινωνίας κατά την οργάνωση καθώς και την εκτέλεση του έργου, με τη χρήση πρακτικών και ατζέντας. Ακόμη, αναφέρονται οι εφαρμογές που χρησιμοποιούνται και ο τρόπος λήψης αποφάσεων εντός της ομάδας με τη χρήση BPMN διαγράμματος. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται το ΔΑΕ με όλες τις δραστηριότητες του έργου με διαγραμματική και αναλυτική απεικόνιση και το διάγραμμα Gantt. Τέλος, παρουσιάζονται οι λίστες παραδοτέων και οροσήμων που προκύπτουν από την ανάλυση του ΔΑΕ. Το συγκεκριμένο έγγραφο αποτελεί το Interim Baseline Report.

1 Εισαγωγή

Το My TAI (My Trip in AI) είναι ένα ετήσιο συνέδριο το οποίο αφορά την ενσωμάτωση και χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στον τομέα του τουρισμού. Το συνέδριο απευθύνεται σε όποιον επιθυμεί να ενημερωθεί περαιτέρω και να εντρυφήσει στον τουριστικό κλάδο με την βοήθεια του AI. Την οργάνωσή του έχει αναλάβει μία ομάδα φοιτητών ενώ η διεξαγωγή του έχει οριστεί στις 25 Μαΐου 2024 στον συνεδριακό χώρο του ξενοδοχείου MET Hotel. Θα συμμετέχουν τουριστικές επιχειρήσεις από χώρες της Ευρώπης που θα παρουσιάσουν την δραστηριότητα τους αλλά και τις επιχειρηματικές τους ιδέες για το μέλλον. Κατά τη διεξαγωγή του συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν ομιλίες, panel συζητήσεων με υψηλόβαθμα στελέχη με σκοπό οι συμμετέχοντες να λάβουν την απαραίτητη πληροφόρηση στους τομείς του τουρισμού και της τεχνητής νοημοσύνης. Επιπλέον, θα στηθούν εκθεσιακά περίπτερα για τον διαμοιρασμό ενημερωτικών φυλλαδίων και την εξατομικευμένη ενημέρωση των άμεσων ενδιαφερομένων. Σκοπός του συνεδρίου είναι η ανάδειξη των καινοτόμων εταιρειών που θα παρευρίσκονται ενισχύοντας έτσι τις συνεργατικές σχέσεις μεταξύ των ευρωπαίων μελών καθώς και ενθάρρυνσή των συμμετεχόντων για την ανάπτυξη και την χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στον τομέα του τουρισμού.

Σκοπός του έργου είναι οι φοιτητές που στελεχώνουν την ομάδα να καταφέρουν να εκπληρώσουν τις απαραίτητες διαδικασίες μέσα στα χρονικά όρια τα οποία έχουν τεθεί ώστε να επιτευχθεί η ομαλή διεξαγωγή του συνεδρίου.

1.1 Σκοπός του εγγράφου

Σκοπός του παρόντος εγγράφου είναι να αναδειχθούν όλες οι διαδικασίες που ακολούθησαν τα μέλη της ομάδας για την πραγματοποίηση διάφορων task καθώς και τις αρμοδιότητες που ανέλαβε ο καθένας. Επιπλέον, παρουσιάζεται η ροή που ακολουθούν οι εργασίες προσδιορίζοντας χρονικούς συσχετισμούς μεταξύ αυτών αλλά και σημαντικά ορόσημα.

1.2 Δομή του εγγράφου

Στο παρόν έγγραφο αναφέρεται η ομάδα έργου, δηλαδή τα μέλη αυτής και οι αρμοδιότητες τους. Έπειτα, γίνεται αναφορά στον σκοπό του έργου και παρουσιάζονται τα εισαγωγικά στοιχεία που αφορούν το θέμα, τον σκοπό καθώς και τους στόχους του

συνεδρίου. Έτσι, ολοκληρώνεται το εύρος του έργου με την προσθήκη των περιορισμών. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται οι εμπλεκόμενοι του έργου και ο συνολικός χάρτης του (project charter). Ακόμη, γίνεται αναφορά στο πλάνο επικοινωνίας που θα ακολουθήσει η ομάδα και στις εφαρμογές που θα χρησιμοποιηθούν για τη συνολική υλοποίηση. Επιπλέον, για την λήψη αποφάσεων εντός ομάδας χρησιμοποιείται ένα διάγραμμα BPMN και η λεπτομερής περιγραφή του. Το πιο σημαντικό μέρος της διαχείρισης του έργου αποτελεί η Δομή Εργασιών ΔΑΕ (WBS) που περιλαμβάνει όλα τα πακέτα εργασίας και τις δραστηριότητες που θα εκτελεστούν συμπεριλαμβανομένων των εκτιμήσεων χρονικής διάρκειας και σχέσεων χρονικής εξάρτησης. Ακολουθεί η παρουσίαση του διαγράμματος Gantt με τον αυστηρό χρονοπρογραμματισμό των δραστηριοτήτων και των πακέτων εργασίας. Τέλος, από το διάγραμμα προκύπτει η λίστα παραδοτέων και η λίστα οροσήμων με τις αντίστοιχες προθεσμίες του κάθε παραδοτέου και οροσήμου καθώς και τον υπεύθυνό τους.

2 Ανάλυση Έργου

Όνομα Έργου	Διοργάνωση επιχειρηματικού συνεδρίου για το AI στον τουρισμό
Ημερομηνία	25 Μαΐου
Project Manager	Λιάμα Παρασκευή

2.1 Εύρος Έργου

Περιγραφή Έργου
Το MY TAI (My trip in AI) αποτελεί ένα συνέδριο που απευθύνεται σε επιχειρήσεις από όλη την Ευρώπη που καινοτομούν στην χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στο τομέα του τουρισμού. Το συνέδριο δίνει την δυνατότητα σε κάθε επιχείρηση να παρουσιάζει την δραστηριότητα της στην ευρωπαϊκή οικονομία μέσω ομιλιών, panel discussions σημαντικών στελεχών καθώς και περιπτέρων για τον διαμοιρασμό ενημερωτικών φυλλαδίων προκειμένου να επιτευχθεί εξατομικευμένη ενημέρωση των συνέδρων. Το συνέδριο αφορά οποιονδήποτε που επιθυμεί να εντρυφήσει στην επιχειρηματική δραστηριότητα και ειδικότερα στο τομέα του τουρισμού με την χρήση της τεχνητής νοημοσύνης.

Εύρος - Scope
Εντός του εύρους του έργου είναι τα παρακάτω: • Διαχείριση οικονομικών πόρων • Δημιουργία γραφικού και βίντεο υλικού

- Διαφημιστική καμπάνια προώθησης του συνεδρίου
- Προστασία προσωπικών δεδομένων των παρουσιάσεων και των ομιλητών
- Διαμόρφωση κανόνων ομιλιών των εκπροσώπων των επιχειρήσεων
- Οργάνωση panel discussions, ομιλιών και workshops
- Οργάνωση και συντονισμός εθελοντών
- Συντονισμός την ημέρα του συνεδρίου
- Παροχή πιστοποίησης παρακολούθησης
- Δυνατότητα πρόσβασης σε άτομα ΑΜΕΑ

Εκτός του εύρους του έργου είναι τα παρακάτω:

- Ξενοδοχειακή κάλυψη για τους ομιλητές και εκπροσώπους επιχειρήσεων
- Κάλυψη περαιτέρω δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων
- Κάλυψη κόστους διατροφής
- Δημοσιογραφική κάλυψη

Περιορισμοί έργου

- Ο αριθμός των αντιπροσώπων των επιχειρήσεων που θα παρευρεθούν να είναι περιορισμένος σε έως τρία άτομα ανά επιχείρηση
- Όλοι όσοι θα παρευρεθούν στο συνέδριο να είναι άνω των 18 ετών
- Οι συμμετέχοντες του συνεδρίου θα πρέπει να έχουν κάποιο background ενασχόλησης με τομείς συναφείς του ΑΙ ή του τουρισμού. Εξαίρεση αποτελούν οι φοιτητές

Πίνακας 1: Εύρος Έργου

2.2 Εμπλεκόμενοι στο έργο

Στο συνέδριο εμπλέκονται αρκετοί προμηθευτές, χορηγοί και άλλοι ενδιαφερόμενοι που συνεισφέρουν με τον δικό τους τρόπο στην οργάνωση και την ομαλή διεξαγωγή του συνεδρίου. Οι προμηθευτές όπως Βίκος, De-Tox και Μίλτος κατόπιν διαπραγμάτευσης με την ομάδα έργου είναι υπεύθυνοι για την προσφορά φαγητού και ποτού την ημέρα του συνεδρίου αξιοποιώντας την ευκαιρία διαφήμισης των προϊόντων και υπηρεσιών τους. Ο

κάθε χορηγός όπως Eurobank, Σκλαβενίτης προωθώντας την δραστηριότητά του προσφέρει ένα συγκεκριμένο χρηματικό ποσό για να μπορέσει η ομάδα έργου να καλύψει ένα μεγάλο μέρος των εξόδων, ενώ τα υπόλοιπα θα καλυφθούν από το ποσό που θα πληρώσει ο κάθε σύνεδρος. Οι εταιρείες υποστήριξης όπως EPT3 και Ραδιοφωνικός Σταθμός - COSMORADIO 95,1 συμβάλλουν αφίλοκερδώς κυρίως στην προώθηση και διαφήμιση του συνεδρίου. Το ξενοδοχείο MET, που είναι ο πιο σημαντικός εμπλεκόμενος, θα φιλοξενήσει το συνέδριο για δύο μέρες αλλά και τους εκπροσώπους των επιχειρήσεων προσφέροντας πλήρης διαμονή. Η ομάδα έργου θα φροντίσει να διεκπεραιωθούν όλες οι απαραίτητες ενέργειες τις ημέρες του συνεδρίου αναλαμβάνοντας το κάθε μέλος ένα συγκεκριμένο πόστο με βάση τους ρόλους και τις ευθύνες που του έχουν ανατεθεί. Οι εθελοντές θα βοηθήσουν την ομάδα έργου και θα φροντίσουν τις ημέρες του συνεδρίου να ακολουθηθεί ακριβώς το πρόγραμμα των ομιλιών και των panel discussions. Τέλος, οι ομιλητές από κάθε επιχείρηση που έχουν δηλώσει ότι θέλουν να παρουσιάσουν το έργο τους θα πρέπει να ακολουθήσουν τους κανόνες που αφορούν τον χρονικό περιορισμό αλλά και τα ζητήματα που θα θίξουν.

2.3 Στόχοι Έργου

- Προσέγγιση τουλάχιστον 30 καινοτόμων εταιρειών από όλη την Ευρώπη που ασχολούνται ενεργά με το AI στον τουρισμό
- Υποστήριξη ανάπτυξης καινοτόμων λύσεων τεχνητής νοημοσύνης για τον τουριστικό κλάδο
- Δημιουργία συνεργατικών δεσμών μεταξύ ευρωπαϊκών και ελληνικών επιχειρήσεων
- Ανάδειξη της Ελλάδας ως κόμβου καινοτομίας στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης για τον τουρισμό

2.4 Project Charter – Χάρτης Έργου

Πίνακας 2: Χάρτης Έργου – Project Charter

2.5 Πλάνο επικοινωνίας και συναντήσεων

2.5.1 Πλάνο Επικοινωνίας – Project Communication Plan

Project Title:	Οργάνωση επιχειρηματικού συνεδρίου με θέμα το AI στον τουρισμό
Project Manager:	Λιάμα Παρασκευή
Date:	25/05/2024

Deliverable Info (What)	Recipient(s) (Who)	Delivery Method(s) (How)	Schedule (When)	Who's Responsible (Owner)
Πληροφορίες Project	Project Team	Zoom calls, δια ζώσης συναντήσεις	2 φορές την εβδομάδα (flexible)	Project Manager
Ενημέρωση προόδου δραστηριοτήτων	Υπεύθυνος Ελέγχου Παραδοτέων	Google Drive, Agendas	5μμ κάθε Δευτέρα	Project Manager
Ενημέρωση	PMO Director,	Email	7μμ κάθε	Project

προόδου Project	Project Coordinator		Παρασκευή	Manager
Κίνδυνοι Project	Project team	Δια ζώσης συναντήσεις	Όποτε κριθεί αναγκαίο	Project Manager

Ποιοί	- Ο PM έρχεται σε επίσημη επικοινωνία με τον υπεύθυνο ελέγχου παραδοτέων σε εβδομαδιαία βάση για τον καλύτερο συντονισμό των αρμοδιοτήτων της ομάδας. - Ο Public Relations Coordinator έρχεται σε επίσημη επικοινωνία με τις εταιρείες που πρόκειται να παρευρεθούν στο συνέδριο και επικοινωνεί μαζί τους για οποιαδήποτε απορία ή πρόβλημα. - Τα μέλη της ομάδας έρχονται σε ανεπίσημη επικοινωνία κάθε φορά που κάποιος χρειάζεται πληροφορίες από το εβδομαδιαίο task του συνεργάτη του. - Ο Task Leader επικοινωνεί με κάθε μέλος της ομάδας είτε επίσημα όταν πρόκειται να αναθέσει νέα task στην ομάδα ή να τα ελέγξει είτε ανεπίσημα σε καθημερινή βάση αν υπάρξει κάποιο θέμα κατά την διεξαγωγή από τα μέλη. - Όλα τα μέλη σε περίπτωση που ανακαλύψουν οποιοδήποτε κίνδυνο προερχόμενο από κάποιο task οφείλουν να το επικοινωνήσουν επισήμως αμέσως στον Task Leader και αυτός με την σειρά του στον PM για να αναθεωρηθούν και να προσδιοριστούν ξανά ορισμένες κομβικές αποφάσεις.
Τί	Στις επίσημες και ανεπίσημες επικοινωνίες μεταξύ των μελών της ομάδας διαπραγματεύονται ζητήματα που αφορούν την ομαλή διεξαγωγή του project. Συγκεκριμένα, συζητούνται προβληματισμοί, απορίες, πιθανοί κίνδυνοι ή αλλαγές που μπορούν να επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό την πορεία του project αλλά και τα ζητήματα που αφορούν τους εξωτερικούς ενδιαφερόμενους (εταιρείες που θα παρουσιάσουν το αντικείμενό τους, χορηγοί κτλ).
Πώς	Εκτός από τις εβδομαδιαίες συναντήσεις που μπορούν να χρησιμοποιούνται ως ένα μέσο ελέγχου της πορείας του project υπάρχει η δυνατότητα

	επικοινωνίας ανάμεσα σε μέλη της ομάδας και εξωτερικούς ενδιαφερόμενους μέσω email, ενώ για τηλεδιασκέψεις προσφέρεται το Zoom, Google Meet και Skype καθώς και το Google Drive για ταυτόχρονη ενημέρωση και επεξεργασία αρχείων από όλα τα μέλη της ομάδας.
Πότε	Οι δια ζώσης συναντήσεις πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση ενώ οι άτυπες που μπορούν να προκύψουν για απρόοπτους λόγους μπορούν να πραγματοποιούνται σε καθημερινή βάση.
Έλεγχος εγγράφων	- Τα πρακτικά κάθε συνάντησεων θα πρέπει να διαβιβάζονται στον Task Leader και τον PM προκειμένου να παρακολουθούν την εξέλιξη των συναντήσεων και αν θα πρέπει να αλλάξει κάτι για να γίνουν πιο αποδοτικές. - Τα ατομικά έγγραφα του κάθε μέλους που δηλώνουν πώς εξελίσσεται το task που έχει αναλάβει πρέπει να παρέχονται εβδομαδιαία στον Task Leader προκειμένου να ελέγχει την απόδοση του κάθε μέλους και αν χρειάζεται να γίνει κάποια αλλαγή στο task.
Αποθήκευση	Οι πληροφορίες μας θα αποθηκεύονται στο cloud το οποίο θα ενημερώνεται σε καθημερινή βάση. Για περισσότερη ασφάλεια, θα έχουμε ένα back-up όπου οι πληροφορίες μας θα αποθηκεύονται σε εβδομαδιαία βάση σε έναν εξωτερικό σκληρό δίσκο για να αποφευχθούν τυχόν απώλειες από το cloud.

Πίνακας 3: Πλάνο Επικοινωνίας – Communication Plan

2.6 Πρακτικά και ατζέντα συναντήσεων

Η ομάδα έργου πραγματοποίησε συνολικά 8 επίσημες συναντήσεις και κατέγραψε τα πρακτικά και την ατζέντα αυτών. Παρακάτω παρατίθενται ενδεικτικά κάποια από αυτά.

2.6.1 Ατζέντα 1ης συνάντησης

Ημερομηνία: 21/03/2024, 17:00 - 19:00

Τόπος: Καφετέρια για διάβασμα

Συμμετέχοντες: Όλη η ομάδα του έργου

Θέματα για συζήτηση:

1. Επιλογή θέματος του συνεδρίου, ημερομηνία και χώρος διεξαγωγής του, 30' (όλοι)
2. Προσδιορισμός στόχων με τις αντίστοιχες ημερομηνίες για την εκπλήρωσή τους, 40' (όλοι)
3. Επιλογή και οργάνωση του chart, 45' (όλοι)
4. Κλείσιμο - Επόμενη συνάντηση, 5' (όλοι)

2.6.2 Πρακτικά 1ης συνάντησης

Ημερομηνία: 21/03/2024, 17:00 - 19:00

Τόπος: Καφετέρια για διάβασμα

Συμμετέχοντες: Όλη η ομάδα του έργου

Θέματα που συζητήθηκαν:

1. Η ομάδα συζήτησε και αποφάσισε το θέμα του συνεδρίου καθώς και την ημερομηνία και τον χώρο που θα διεξαχθεί. Η απόφαση πάρθηκε με την σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της ομάδας.
2. Η ομάδα έθεσε τους στόχους που θα πρέπει να εκπληρωθούν με την λήξη του συνεδρίου σχετικά με:
 - (α) την προώθηση του τουριστικού κλάδου για την Ελλάδα και
 - (β) την ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ των ευρωπαϊκών και των των ελληνικών επιχειρήσεων
3. Η Project Manager σε συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας ξεκίνησε να συμπληρώνει ορισμένα πεδία του Chart, ωστόσο:
 - (α) είναι απαραίτητο να έρθουμε σε επικοινωνία με τον διδάσκοντα για να λύσουμε ορισμένες απορίες σχετικά με το Score και
 - (β) ο Λάμπρογλου, έπειτα από απόφαση της ομάδας, να συμπληρώσει κάποια πεδία του Chart τα οποία δεν συμπληρώθηκαν στα χρονικά πλαίσια που ορίστηκαν.
4. Η συνάντηση τελείωσε στην προγραμματισμένη ώρα και η ομάδα αποφάσισε η επόμενη συνάντηση να γίνει στις 29/03, 19:00 - 21:00 στον ίδιο χώρο.

Ενέργεια	Υπεύθυνος	Προθεσμία
Ανάρτηση πρακτικών	Κοντοπούλου	23/03/2024
Επικοινωνία με διδάσκοντα για διευκρινίσεις για το Scope	Λιάμα, Κούβαρος	27/03/2024
Συμπλήρωση ορισμένων πεδίων Chart	Λάμπρογλου	29/03/2024
Ετοιμασία και ανάρτηση ατζέντας 2ης συνάντησης	Κοντοπούλου	29/03/2024

2.6.3 Ατζέντα 5ης συνάντησης

Ημερομηνία: 10/04/2024, 17:00 - 20:00

Τόπος: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, εργαστήριο 234

Συμμετέχοντες: Όλη η ομάδα του έργου

Θέματα για συζήτηση:

1. Συζήτηση και ολοκλήρωση του ΔΑΕ, 50' (όλοι)
2. Συζήτηση σχετικά με την δημιουργία του Gantt Chart, 60' (όλοι)
3. Δημιουργία του Calendar και του Gantt Chart στο Microsoft Project, 60' (όλοι)
4. Κλείσιμο - Επόμενη συνάντηση, 10' (όλοι)

2.6.4 Πρακτικά 5ης συνάντησης

Ημερομηνία: 10/04/2024, 17:00 - 20:00

Τόπος: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, εργαστήριο 234

Συμμετέχοντες: Όλη η ομάδα

Θέματα που συζητήθηκαν:

1. Η ομάδα συζήτησε και ολοκλήρωσε το ΔΑΕ, 50' (όλοι)

2. Η ομάδα συζήτησε και αποφάσισε τις δραστηριότητες που θα συμπεριληφθούν στο Gantt Chart, 60' (όλοι)
3. Η ομάδα δημιούργησε το ημερολόγιο εργασίας των μελών και στην συνέχεια υλοποίησε το διάγραμμα Gantt Chart στο Microsoft Project που προσφέρουν οι εργαστηριακοί υπολογιστές, 60' (όλοι)
4. Η συνάντηση τελείωσε με την λήξη των εργαστηρίων. Η ομάδα αποφάσισε η επόμενη συνάντηση να γίνει την Παρασκευή

12/04/2024, 10:00 - 12:00, διαδικτυακή συνάντηση μέσω Discord

Ενέργεια	Υπεύθυνος	Προθεσμία
Ανάρτηση πρακτικών	Κοντοπούλου	10/04/2024
Ετοιμασία και ανάρτηση ατζέντας 8ης συνάντησης	Κοντοπούλου	12/04/2024

2.6.5 Ατζέντα 8ης συνάντησης

Ημερομηνία: 18/04/2024, 15:00 - 17:00

Τόπος: Καφετέρια για διάβασμα

Συμμετέχοντες: Καρακίτσου, Κοντοπούλου, Κούβαρος, Λιάμα

Απόντες: Λάμπρογλου (ειδοποίησε)

Θέματα για συζήτηση:

1. Εύρεση ονομασίας και κατασκευή λογοτύπου του συνεδρίου, 30' (Κοντοπούλου)
2. Κατασκευή δενδρογράμματος WBS, 90' (Καρακίτσου)
3. Συγγραφή Προλόγου, Σκοπού Έργου, 30' (Κοντοπούλου)
4. Ολοκλήρωση της λίστας παραδοτέων και οροσήμων, 60' (Λιάμα - Κούβαρος)

5. Έλεγχος όσων είχαν ολοκληρωθεί, 10' (όλοι)
6. Διαμοιρασμός εργασιών για παράδοση στην επόμενη συνάντηση, 10' (όλοι)
7. Κλείσιμο συνάντησης - Επόμενη συνάντηση, 10' (όλοι)

2.6.6 Πρακτικά 8ης συνάντησης

Ημερομηνία: 18/04/2024, 15:00 - 17:00

Τόπος: Καφετέρια για διάβασμα

Συμμετέχοντες: Καρακίτσου, Κοντοπούλου, Κούβαρος, Λιάμα

Απόντες: Λάμπρογλου (ειδοποίησε)

Θέματα που συζητήθηκαν:

Η ομάδα με σκοπό την ταχύτερη υλοποίηση των διαδικασιών του έργου που ορίστηκαν στην ατζέντα της συγκεκριμένης συνάντησης, χώρισε τις διαδικασίες αυτές στα μέλη της και έτσι:

1. Η Κοντοπούλου παρουσίασε στα μέλη της ομάδας τα πιθανά ονόματα για το συνέδριο και αποφασίστηκε η επίσημη ονομασία του
(α) έπειτα με βάση την ονομασία του συνεδρίου η Κοντοπούλου κατασκεύασε κάποια λογότυπα
(β) παρουσίασε τα πιθανά λογότυπα του συνεδρίου στην υπόλοιπη ομάδα όπου και κατοχυρώθηκε ένα από αυτά, 30'
2. Η Καρακίτσου από την έναρξη μέχρι και την λήξη της συνάντησης ασχολήθηκε με το WBS, το οποίο ανέλαβε να το ολοκληρώσει μέχρι την επόμενη συνάντηση, 90'
3. Η Κοντοπούλου ανέλαβε στην συνέχεια να γράψει την εισαγωγή και τον σκοπό του έργου που ήταν απαραίτητο για το παραδοτέο, 30'
4. Η Λιάμα και ο Κούβαρος ανέλαβαν να ολοκληρώσουν την λίστα των παραδοτέων και των οροσήμων, 60'

5. Η ομάδα έλεγξε ξανά όλα τα task που ολοκληρώθηκαν κατά την διάρκεια της συνάντησης, 10' (όλοι)

6. Η ομάδα αποφάσισε να μοιράσει ορισμένες εργασίες στα μέλη για την επόμενη συνάντηση και έτσι αποφασίστηκε ότι:

(α) Η Καρακίτσου θα αναλάβει να ολοκληρώσει το WBS

(β) Η Κοντοπούλου θα αναλάβει να συγγράψει την Επιτελική Σύνοψη και την Δομή του εγγράφου

(γ) Ο Κούβαρος θα αναλάβει να συγκεντρώσει όλα τα αρχεία που χρειάζονται το περιεχόμενο τους και να συρράψει το Deliverable Template

(δ) Η Λιάμα θα αναλάβει να συγγράψει την σύντομη περιγραφή του WBS

7. Η συνάντηση τελείωσε στην προκαθορισμένη ώρα. Η ομάδα αποφάσισε η επόμενη συνάντηση να γίνει στις 22/04/2024, διαδικτυακά μέσω Discord, 10' (όλοι)

Ενέργεια	Υπεύθυνος	Προθεσμία
Ανάρτηση πρακτικών	Κοντοπούλου	18/04/2024
Ολοκλήρωση WBS	Καρακίτσου	21/04/2024
Συγγραφή Επιτελική Σύνοψης και Δομής Εγγράφου	Κοντοπούλου	21/04/2024
Συμπλήρωση του Deliverable Template με όλα τα αρχεία	Κούβαρος	21/04/2024
Συγγραφή σύντομης περιγραφής του WBS	Λιάμα	21/04/2024
Ετοιμασία και ανάρτηση ατζέντας 9ης συνάντησης	Κοντοπούλου	21/04/2024

2.7 Εφαρμογές για την υποστήριξη της ομαδικής εργασίας

2.7.1 Εφαρμογές για την επικοινωνία μεταξύ των μελών:

- Discord
- Gmail
- Messenger (άτυπη επικοινωνία)

2.7.2 Εφαρμογές για την επεξεργασία και τον διαμοιρασμό αρχείων:

- Google Drive (Αποθήκευση παραδοτέων εργασίας για κοινή χρήση με την ομάδα έργου)
- Google Docs (Σύνταξη εγγράφων)
- Google Sheets
- WeTransfer (για τον διαμοιρασμό μεγάλων αρχείων)


2.7.3 Εφαρμογές για την οργάνωση του συνεδρίου:

- Microsoft Project (Σχεδιασμός διαγράμματος Gantt)
- Dia (Σχεδιασμός WBS)

2.7.4 Εφαρμογές για την οργάνωση των ομαδικών συναντήσεων

- Asana

Ενδεικτικό παράδειγμα χρήσης της εφαρμογής Asana:

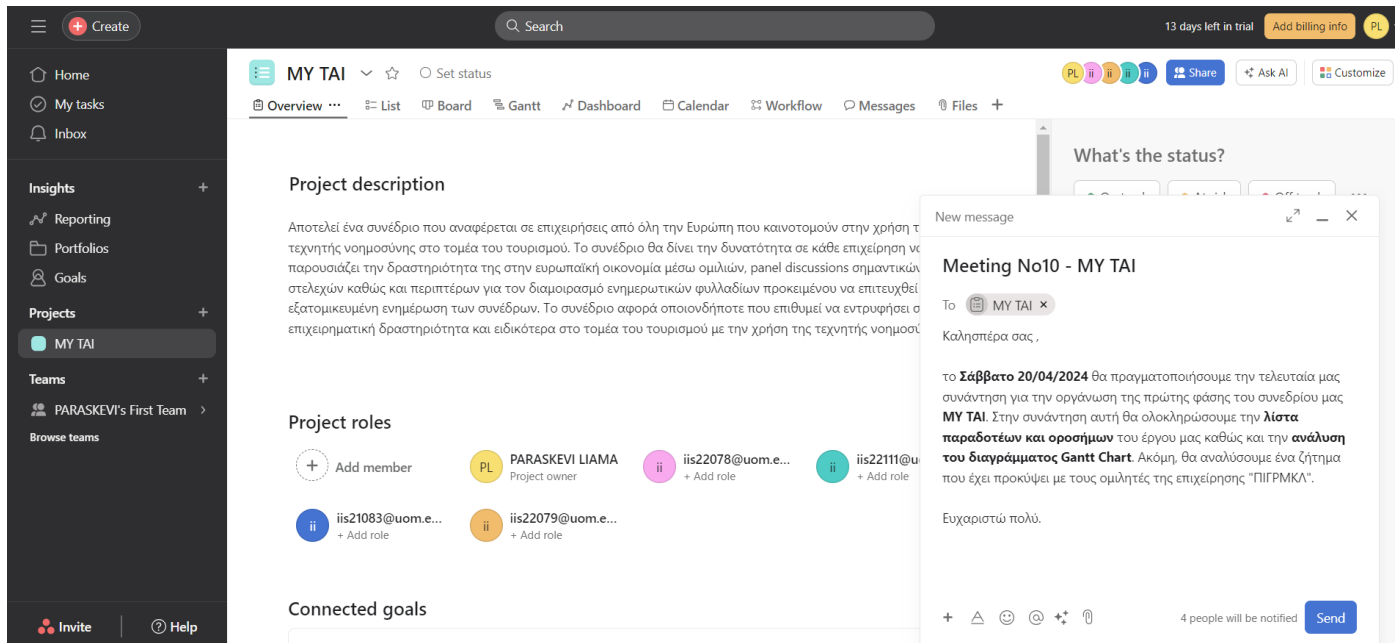


The screenshot displays the Asana project interface for 'MY TAI'. The left sidebar shows navigation options like Home, My tasks, Inbox, Insights, Reporting, Portfolios, Goals, Projects (with 'MY TAI' selected), Teams, and PARASKEVI's First Team. The main content area includes a 'Project description' section with text about a conference, a 'Project roles' section listing team members like PARASKEVI LIAMA (Project owner) and others, and a 'Connected goals' section. A 'New message' pop-up window is visible, titled 'Meeting No10 - MY TAI', containing a message about a meeting on Saturday 20/04/2024 and a 'Send' button.

Εικόνα 1: Παράδειγμα χρήσης Asana

2.8 Διαδικασία λήψης αποφάσεων


Εικόνα 2: Διαδικασία λήψης αποφάσεων

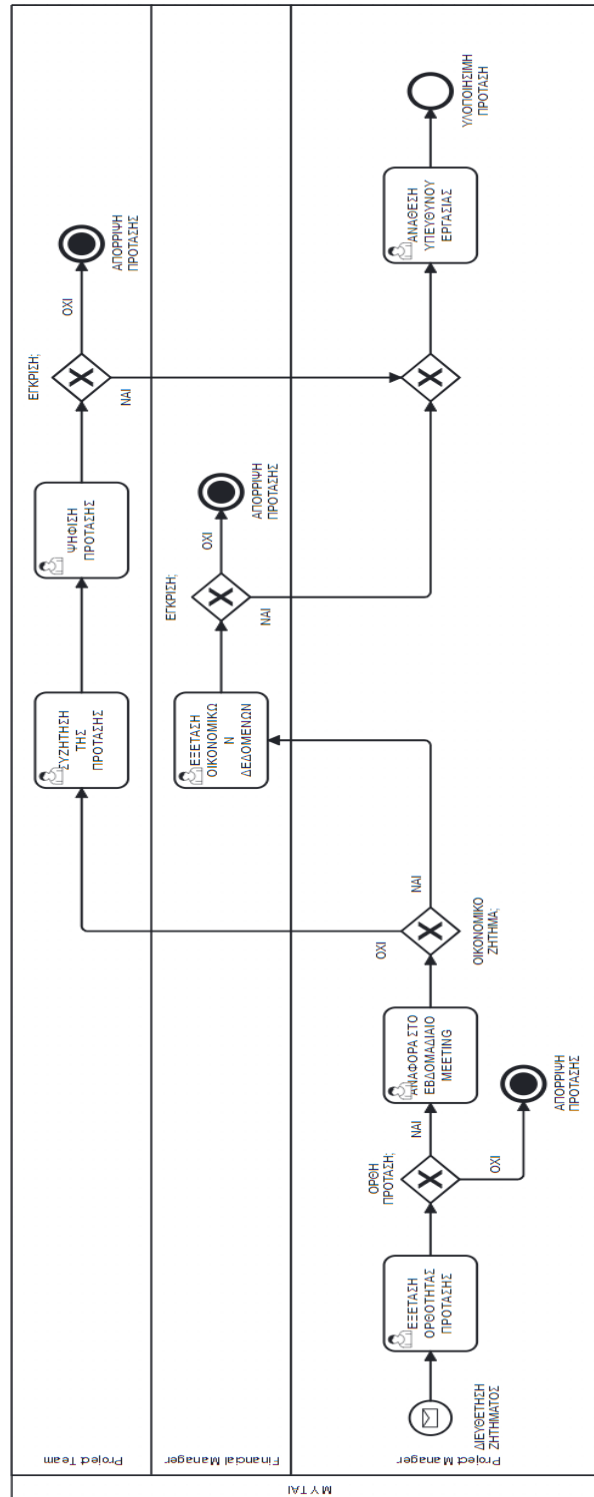

2.8.1 Ανάλυση BPMN διαγράμματος

Στο BPMN διάγραμμα παρουσιάζεται η διαδικασία που ακολουθείται για την λήψη αποφάσεων εντός της ομάδας έργου. Συγκεκριμένα, ο PM εξετάζει το ζήτημα που δημιουργήθηκε για να αξιολογήσει την βαρύτητά του στην εξέλιξη του έργου και αν αυτό χρήζει διαπραγμάτευσης ή όχι. Αν πρόκειται για πρόβλημα που απαιτεί άμεση αντιμετώπιση τότε γίνεται έκτακτη συνάντηση διαφορετικά αναφέρεται στο εβδομαδιαίο meeting. Αν το ζήτημα είναι οικονομικό ο PM καθιστά υπεύθυνο τον Financial Manager για την διευθέτηση του θέματος, διαφορετικά γίνεται ψήφισμα από όλη την ομάδα έργου συμπεριλαμβανομένου του PM. Σε κάθε περίπτωση, η γνώμη του PM συμβάλλει καθοριστικά στην τελική απόφαση σχετικά με την απόρριψη ή την αποδοχή της πρότασης για την επίλυση του προβλήματος. Τέλος, με την έγκριση της απόφασης ο PM αναθέτει τον υπεύθυνο εργασίας.

Εικόνα 3: Δομή Ανάλυσης Έργου (WBS)

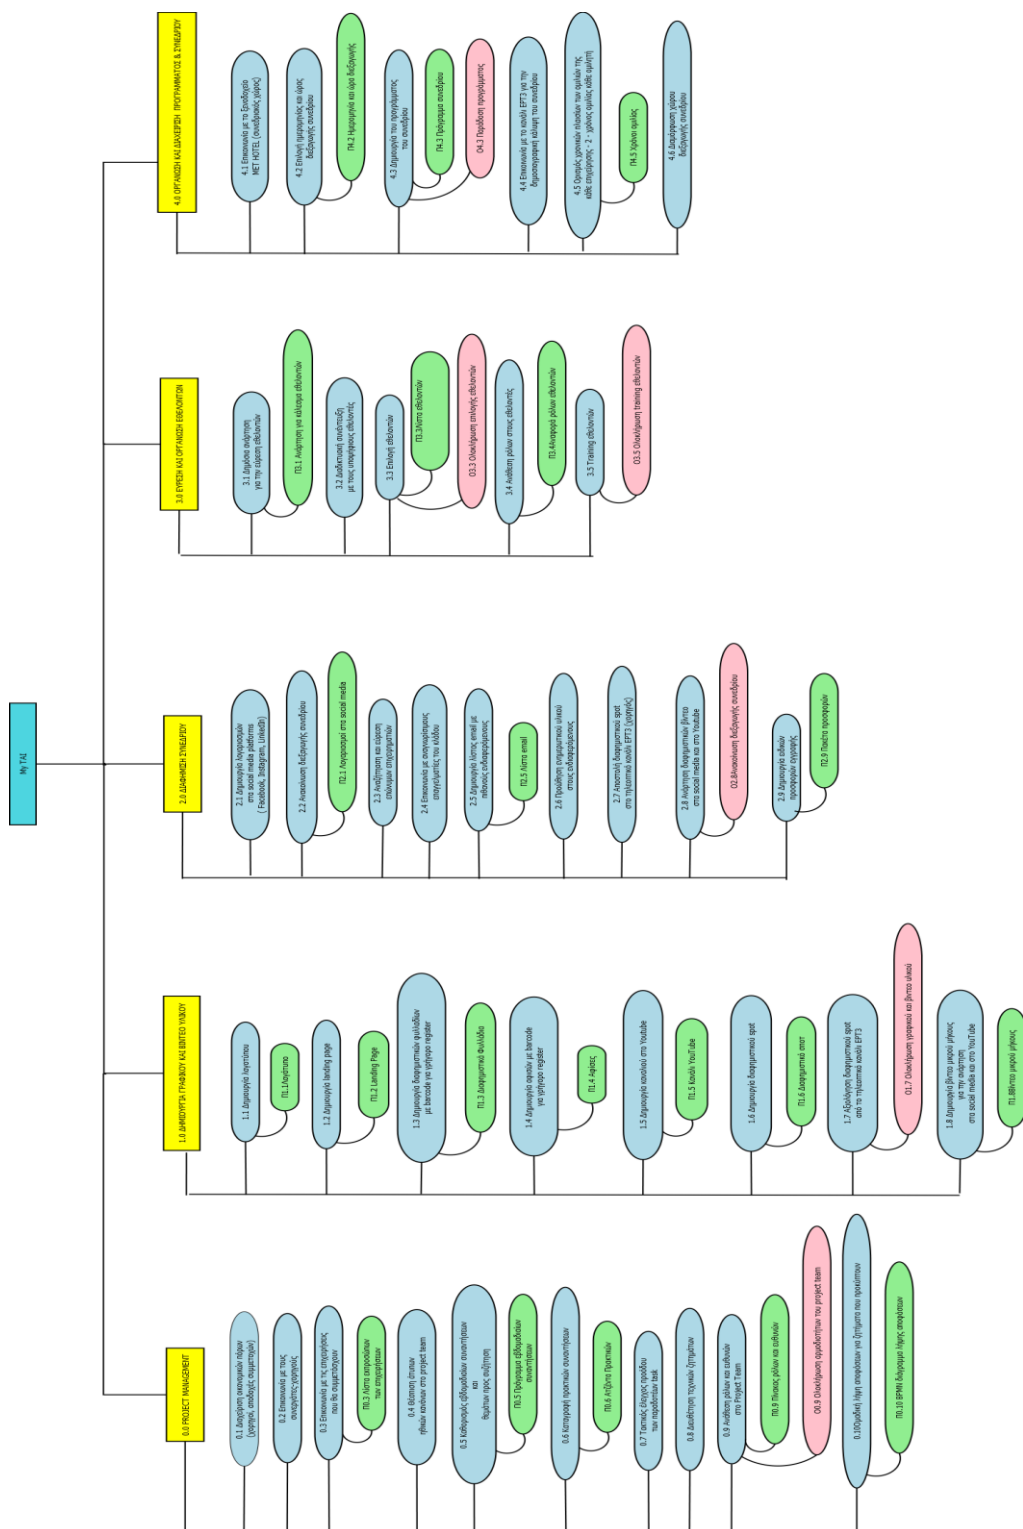

2.9.1 Ανάλυση WBS

Με βάση το Gantt Chart οι δραστηριότητες εκτελούνται στο διάστημα 18/04/2024-23/05/2024 και το συνέδριο πραγματοποιείται στις ημερομηνίες 25-26/05/2024. Το πρώτο πακέτο εργασίας (ΠΕ 0) αναφέρεται στο Project Management. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει τις δραστηριότητες που σχετίζονται με τον συντονισμό του συνεδρίου και της ομάδας έργου και θεωρούνται ανοιχτά ζητήματα μέχρι και την ημέρα διεξαγωγής του συνεδρίου. Το δεύτερο πακέτο εργασίας (ΠΕ 1) αναφέρεται στην δημιουργία γραφικού και βίντεο υλικού. Ειδικότερα, περιλαμβάνει ορισμένες δραστηριότητες και ενέργειες που πρέπει να γίνουν πριν την διαφήμιση και την προώθηση του συνεδρίου. Αυτό σημαίνει ότι χρονολογικά οι ημερομηνίες παραδοτέων των συγκεκριμένων task θα πρέπει να προηγούνται της ανακοίνωσης διεξαγωγής του συνεδρίου. Το τρίτο πακέτο εργασίας (ΠΕ 2) αναφέρεται στην διαφήμιση και την προώθηση του συνεδρίου. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει δραστηριότητες που αφορούν την γνωστοποίηση του συνεδρίου σε πιθανούς ενδιαφερόμενους με προσωπικό email αλλά και σε τρίτους μέσω των Social Media αλλά και του χορηγού-EPT3. Το συγκεκριμένο πακέτο εργασίας θεωρείται ενεργό μέχρι και την πρώτη μέρα διεξαγωγής του συνεδρίου κατά την οποία οι εγγραφές θα μπορούν να γίνουν δια ζώσης. Το τέταρτο πακέτο εργασίας (ΠΕ 3) αναφέρεται στους εθελοντές του συνεδρίου. Οι δραστηριότητες αφορούν την εύρεση εθελοντών, αφού πρώτα προηγηθεί χρονικά η ανακοίνωση του συνεδρίου, καθώς και τον συντονισμό αυτών μέχρι και 2 μέρες πριν την έναρξη του συνεδρίου. Το πέμπτο πακέτο εργασίας (ΠΕ 4) είναι το τελευταίο του διαγράμματος Gantt και αναφέρεται σε δραστηριότητες που αφορούν το πρόγραμμα των ημερών του συνεδρίου αλλά και τον χώρο διεξαγωγής του.

2.10 Λίστα Παραδοτέων και Οροσήμων

2.10.1 Λίστα Παραδοτέων

α/α	Όνομα	Υπεύθυνος	Ημερομηνία Παράδοσης
Π0.3	Λίστα εκπροσώπων των επιχειρήσεων	Project Manager	23/04/2024
Π0.5	Πρόγραμμα εβδομαδιαίων συναντήσεων	Project Manager	20/04/2024
Π0.6	Ατζέντα Πρακτικών	Project Manager	22/05/2024
Π0.9	Πίνακας ρόλων και ευθυνών	Project Manager	19/04/2024
Π0.10	BPMN διάγραμμα λήψης αποφάσεων	Project Manager	20/04/2024
Π1.1	Λογότυπο	Project Manager	18/04/2024
Π1.2	Landing Page	Project Manager	22/04/2024
Π1.3	Διαφημιστικά Φυλλάδια	Project Manager	29/04/2024
Π1.4	Αφίσες	Project Manager	29/04/2024
Π1.5	Κανάλι YouTube	Project Manager	19/04/2024
Π1.6	Διαφημιστικό σποτ	Project Manager	08/05/2024
Π1.8	Βίντεο μικρού μήκους	Project Manager	01/05/2024
Π2.1	Λογαριασμοί στα social media	Project Manager	19/04/2024
Π2.5	Λίστα email	Project Manager	13/05/2024
Π2.9	Πακέτα προσφορών	Project Manager	18/04/2024
Π3.1	Ανάρτηση για κάλεσμα εθελοντών	Project Manager	22/04/2024
Π3.3	Λίστα εθελοντών	Project Manager	01/05/2024
Π3.4	Αναφορά ρόλων εθελοντών	Project Manager	14/05/2024
Π4.2	Ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής	Project Manager	22/04/2024

P4.3	Πρόγραμμα συνεδρίου	Project Manager	29/04/2024
P4.5	Χρόνοι ομιλίας	Project Manager	01/05/2024

Πίνακας 4: Λίστα Παραδοτέων

Σημειώσεις:

1. Το παραδοτέο Π0.3 προκύπτει από την επικοινωνία της ομάδας έργου με τις επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν. Αποτελεί παραδοτέο γιατί η ομάδα έργου χρειάζεται να γνωρίζει από νωρίς με ποιες επιχειρήσεις θα εξακολουθεί να είναι σε επικοινωνία καθόλη την διάρκεια οργάνωσης αλλά και διεξαγωγής του συνεδρίου.

2. Τα παραδοτέα πρόγραμμα εβδομαδιαίων συναντήσεων, πίνακας ρόλων και ευθυνών καθώς και το BPMN διάγραμμα λήψης αποφάσεων παραδίδονται σε πρώτη φάση στην εκκίνηση του έργου για να γνωρίζει η ομάδα πως θα δουλέψει, ωστόσο υπάρχουν στο Project Management ως δραστηριότητες γιατί πρέπει να ενημερώνονται στην ροή του project.

2.10.2 Λίστα Οροσέμων

α/α	Όνομα	Πακέτο Εργασίας	Ημερομηνία
Ο Εκκίνησης	Start	-	18/04/2024
O0.9	Ολοκλήρωση αρμοδιοτήτων του project team	Project Management	23/05/2024
O1.7	Ολοκλήρωση γραφικού και βίντεο υλικού	Δημιουργία γραφικού και βίντεο υλικού	10/05/2024
O2.8	Ανακοίνωση διεξαγωγής συνεδρίου	Διαφήμιση Συνεδρίου	02/05/2024
O2.3	Ολοκλήρωση επιλογής εθελοντών	Εύρεση και οργάνωση εθελοντών	01/05/2024
O3.5	Ολοκλήρωση training εθελοντών	Εύρεση και οργάνωση εθελοντών	23/05/2024
O4.3	Παράδοση προγράμματος	Οργάνωση και Διαχείριση προγράμματος συνεδρίου	29/04/2024

Ο Τέλους	Finish	-	23/05/2024
----------	--------	---	------------


Πίνακας 5: Λίστα Οροσήμων
Σημειώσεις:

Η ολοκλήρωση αρμοδιοτήτων της ομάδας έργου ορίζεται ως ορόσημο διότι δηλώνει την ημερομηνία που όλη η ομάδα είναι έτοιμη, τα task έχουν ολοκληρωθεί και μπορεί να ξεκινήσει το συνέδριο.

2.11 Διάγραμμα Gantt

Στο διάγραμμα Gantt με κόκκινο χρώμα φαίνεται η κρίσιμη διαδρομή.

	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors
1	Start	0 days	Thu 18/4/24	Thu 18/4/24	
2	⇒ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ ΥΛΙΚΟΥ	14 days	Thu 18/4/24	Fri 10/5/24	
3	Δημιουργία λογοτύπου	1 day	Thu 18/4/24	Thu 18/4/24	1
4	Δημιουργία landing page	2 days	Fri 19/4/24	Mon 22/4/24	3
5	Δημιουργία διαφημιστικών φυλλαδίων με barcode για γρήγορο register	5 days	Tue 23/4/24	Mon 29/4/24	3;4
6	Δημιουργία αφισών με barcode για γρήγορο register	5 days	Tue 23/4/24	Mon 29/4/24	3;4
7	Δημιουργία καναλιού στο Youtube	1 day	Fri 19/4/24	Fri 19/4/24	3
8	Δημιουργία διαφημιστικού spot	10 days	Mon 22/4/24	Wed 8/5/24	7
9	Αξιολόγηση διαφημιστικού spot από το τηλεοπτικό κανάλι EPT3	2 days	Thu 9/5/24	Fri 10/5/24	8
10	Δημιουργία βίντεο μικρού μήκους για την ανάρτηση στα social media και στο YouTube	8 days	Mon 22/4/24	Wed 1/5/24	7
11	⇒ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ	17 days	Thu 18/4/24	Wed 15/5/24	
12	Δημιουργία λογαριασμών στα social media platforms(Facebook, Instagram, LinkedIn)	1 day	Fri 19/4/24	Fri 19/4/24	3
13	Ανακοίνωση διεξαγωγής συνεδρίου	1 day	Mon 22/4/24	Mon 22/4/24	12
14	Αναζήτηση και εύρεση επώνυμων επιχειρηματιών	1 day	Thu 18/4/24	Thu 18/4/24	1
15	Επικοινωνία με αναγνωρισμένους επαγγελματίες του κλάδου	9 days	Fri 19/4/24	Wed 1/5/24	14
16	Δημιουργία λίστας email με πιθανούς ενδιαφερόμενους	5 days	Thu 2/5/24	Mon 13/5/24	15
17	Πρώτωση ενημερωτικού υλικού στους ενδιαφερόμενους	2 days	Tue 14/5/24	Wed 15/5/24	16
18	Αποστολή διαφημιστικού spot στο τηλεοπτικό κανάλι EPT3 (χορηγός)	3 days	Thu 9/5/24	Mon 13/5/24	8
19	Ανάρτηση διαφημιστικών βίντεο στα Social Media και στο YouTube	1 day	Thu 2/5/24	Thu 2/5/24	7;10;12
20	Δημιουργία ειδικών προσφορών εγγραφής	1 day	Thu 18/4/24	Thu 18/4/24	1
21	⇒ ΕΥΡΕΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ	21 days	Mon 22/4/24	Thu 23/5/24	
22	Δημόσια ανάρτηση για την εύρεση εθελοντών	1 day	Mon 22/4/24	Mon 22/4/24	12
23	Διαδικτυακή συνέντευξη με τους υποψήφιους εθελοντές	5 days	Tue 23/4/24	Mon 29/4/24	22
24	Επιλογή εθελοντών	2 days	Tue 30/4/24	Wed 1/5/24	23
25	Ανάθεση ρόλων στους εθελοντές	6 days	Thu 2/5/24	Tue 14/5/24	24
26	Training εθελοντών	7 days	Wed 15/5/24	Thu 23/5/24	25
27	⇒ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ & ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ	10 days	Thu 18/4/24	Wed 1/5/24	
28	Επικοινωνία με το ξενοδοχείο MET HOTEL (συνεδριακός χώρος)	2 days	Thu 18/4/24	Fri 19/4/24	1
29	Επιλογή ημερομηνίας και ώρας διεξαγωγής συνεδρίου	1 day	Mon 22/4/24	Mon 22/4/24	28
30	Δημιουργία του προγράμματος του συνεδρίου	5 days	Tue 23/4/24	Mon 29/4/24	29
31	Επικοινωνία με το κανάλι EPT3 για την δημοσιογραφική κάλυψη του συνεδρίου	2 days	Tue 23/4/24	Wed 24/4/24	13
32	Ορισμός χρονικών πλαισίων των ομιλιών της κάθε επιχείρησης	2 days	Tue 30/4/24	Wed 1/5/24	30
33	Διαμόρφωση χώρου διεξαγωγής συνεδρίου	6 days	Mon 22/4/24	Mon 29/4/24	28
34	Finish	0 days	Thu 23/5/24	Thu 23/5/24	5;6;17;18;19;20;26;31;32;33;9

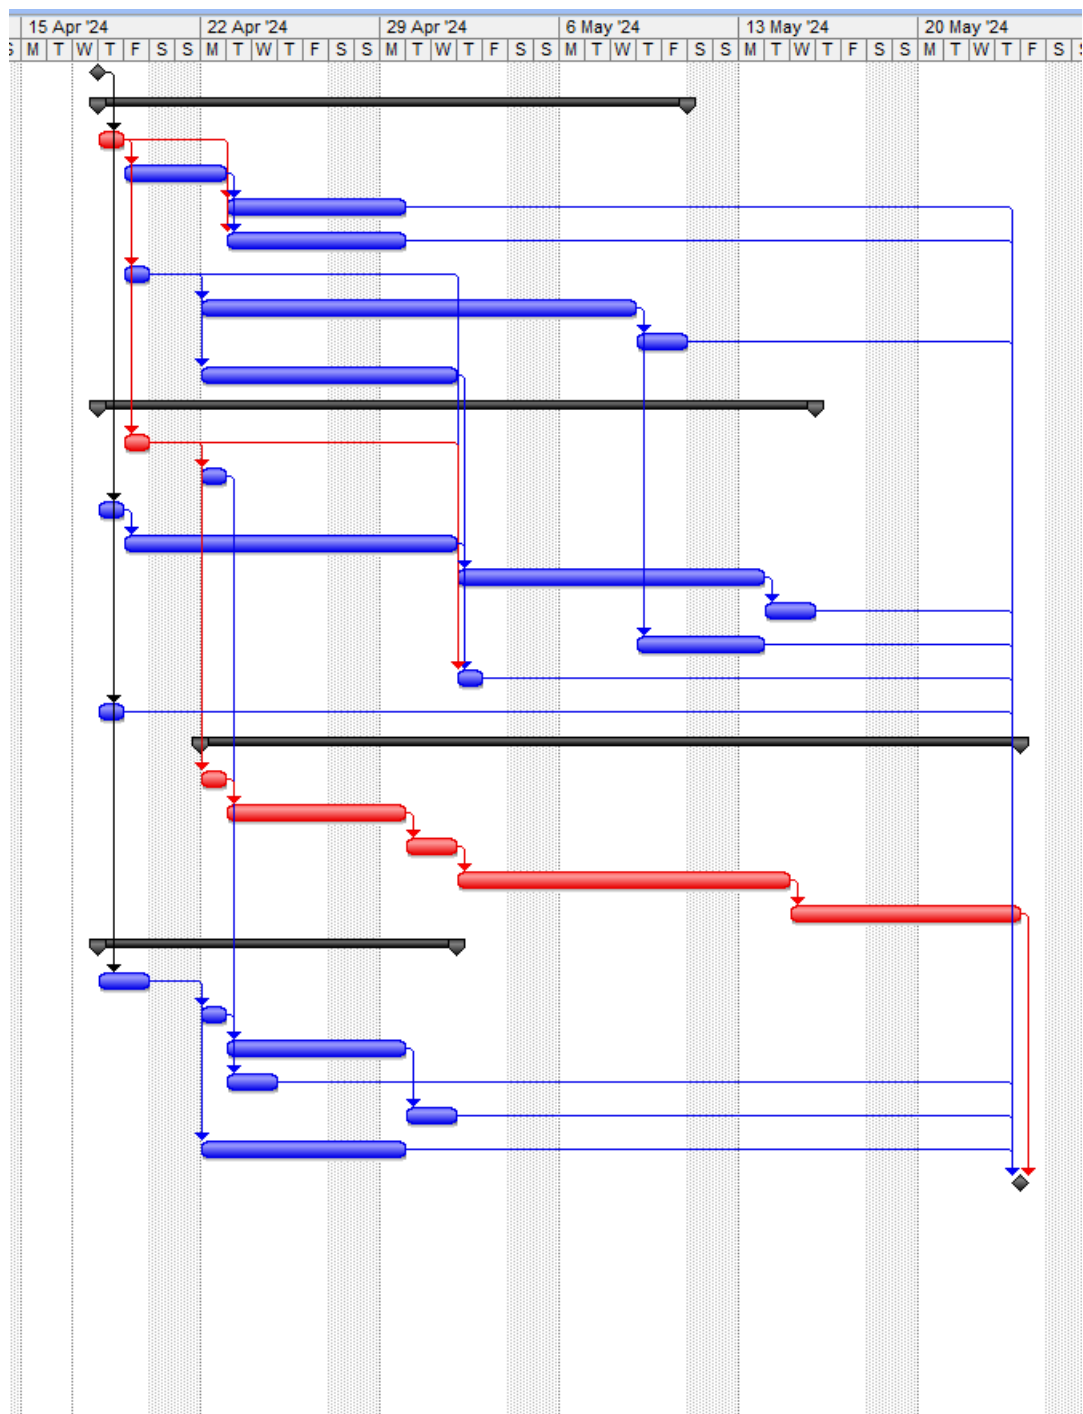

Εικόνα 4: Διάγραμμα Gantt

3 Πηγές

- Καραγκούνη. (n.d.). Συμβουλές Οργάνωσης - Synedrio + Event. Synedrio + Event. <https://www.synedrio.gr/category/%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AD%CF%82-%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%AC%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CE%B4%CF%81%CE%AF%CF%89%CE%BD/>
- How to Create a Work Breakdown Structure. (2019, October 1). Lucidchart. <https://www.lucidchart.com/blog/how-to-create-a-work-breakdown-structure-and-why-you-should>
- What is a communication plan and why it's important: a guide. (n.d.). Bonterra. <https://www.bonterratech.com/blog/communication-plan>
- Gantt.com. (n.d.). Gantt.com. <https://www.gantt.com/>
